

日报

中车株洲车辆有限公司屋顶 光伏电站项目		日期	2022.12.20		
天气	阴	风力	1 级	温度	3-11℃
今日作业 情况	1、施工人数 条基封边及吊装 12 人，公母头插接 2 人，组件安装 16 人，电气施工 6 人，支架划线打孔 2 人 2、施工机械 吊车 1 台 3、今日完成工作： 1、2#组装组件安装完成 180 块 2、支架安装完成 200 根， 3、2#备料逆变器端电缆头制作已完成 4、2#组装直流电缆敷设完成 2000 米 5、2#组装清洗系统水管安装完成 200 米				
明日工作 计划	1. 2#组装组件吊装 2. 箱变低压侧电缆头制作 3. 2#组装公母头制作				
到货累计 数量	1.组件到货 5100 块。（3.06MW）。 2.逆变器共计 11 台。已全部进场。 3.支架共计 160 组。已全部进场。 4.MC4 接头共计 640 套。已全部进场。 5.桥架共计 1013 米。已全部进场。 6.光伏电缆共计 29000 米。已全部进场。 7.接地线共计 1431 米。已全部进场。 8.接地扁钢共计 2520 米。已全部进场。 9.电力电缆共计 2132 米。已全部进场。 10.箱变已进场。				
今日监理 工作情况	1.检查 备料车间屋面条基组装安装情况，要求施工人员按规范安装。 2.检查巡视备料车间组件安装情况，要求施工人员按规范安装。 3. 逆变器端电缆头制作检查。要求施工人员按规范安装。				
其他事项或 协调问题					

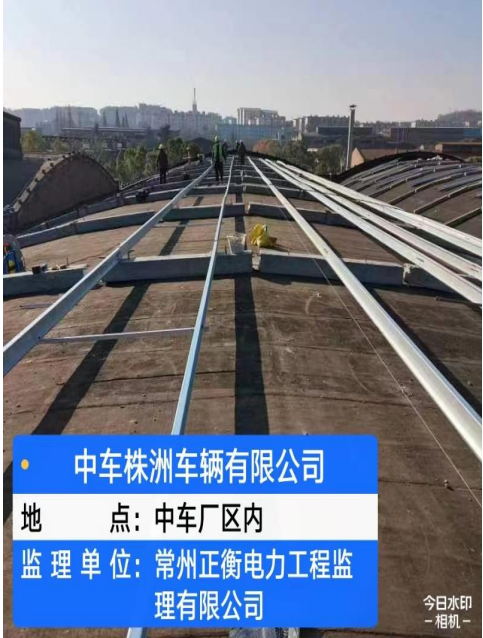
本日现场监理人员：

记录人：

项目总体建设进度汇总：

1. 组件安装完成 4170 块，共计 5100，完成 81.76%；
2. 条基预制完成 5000 米，共计 5000 米，完成 100%；
3. 支架安装 157 组，共计 160 组，完成 98.13%；
4. 逆变器共计 11 台，已全部进场；
5. 桥架安装共计 1013 米，安装 980 米，完成 96.74%。
6. 光伏电缆敷设 19000 米，共计 29000 米，完成 65.52%。
7. 接地扁铁焊接 1200 米，共计 2520 米，完成 47.62%。
8. 接地极 15 根，完成 100%。
9. 高压电缆敷设完成 1700 米，共计 2123 米，完成 79.74%。
10. MC4 接头插件安装完成 375 套，共计 640 套，完成 58.59%。
11. 接地线连接完成 950 米，共计 1431 米，完成 66.39%。

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	组件安装	条基吊装
照片	 • 中车株洲车辆有限公司 地 点：中车厂区内 监 理 单 位：常州正衡电力工程监 理有限公司	 • 中车株洲车辆有限公司 地 点：中车厂区内 监 理 单 位：常州正衡电力工程监 理有限公司
文字描述	电缆敷设	清洗系统水管安装
照片	 • 中车株洲车辆有限公司 地 点：中车厂区内 监 理 单 位：常州正衡电力工程监 理有限公司	 • 中车株洲车辆有限公司 地 点：中车厂区内 监 理 单 位：常州正衡电力工程监 理有限公司
