

大韩道恩 0.229 万千瓦综合智慧 零碳电厂项目

工 程 日 报

提交部门：常州正衡项目监理部

日期：2023 年 09 月 10 日

工程日报表

施工日期：2023 年 09 月 10 日

天气情况：晴 24℃-35℃

一、项目进展：

1. 场平情况：无

2. 土建工程：

分项工程	工程总量	当日完成量	累计完成量	累计完成率
箱变基础				
预制舱基础				

3. 阵列区机电安装工程：

分项工程	工程总量	当日完成量	累计完成量	累计完成率
支架安装	2.29MW	0MW	2.29MW	100%
组件安装	4020 块	0 块	4020 块	100%
逆变器安装	36 台	0 台	36 台	100%
电缆支架(桥架)安装	800 米	0 米	800 米	100%
接地装置安装	1.8 千米	0 千米	0 千米	0%
光伏电缆安装	39000 米	0 米	36500 米	93%
交流电缆安装	4927 米	1300 米	2871 米	58%

4. 机电安装工程：

分项工程	工程总量	当日完成量	累计完成量	累计完成率
光伏并网柜安装	6 面	0	6 面	100%
调试工作	0%	0	0%	0%

5. 送出工程：无

6. 并网情况：

分项工程	工程总量	当日完成量	累计完成量	累计完成率
开关站倒送电	2.29MW	0	0%	0%
并网容量	2.29MW	0	0MW	0%

二、当日工作完成情况：

1. 安全文明情况

- 1) 施工现场对施工通道、材料堆放进行安全检查；
- 2) 例行完成班前会及安全教育并签字确认。

2. 完成的工程量

- 1) 交流线铺设 1300 米

3. 现场人员、机具情况

施工方施工总人数：5 人。

今日机械设备：无

三、主要设备及材料到货情况：

序号	名称/型号	总数量	累计到货	计划到货时间	生产厂家
1	光伏组件	4020 块	1.5MW	07.30	浙江宏阳
3	逆变器	36 台	36 台	07.10	华为
	生产车间一	18 台	18 台		华为
	生产车间二	18 台	18 台		华为
4	光伏并网柜	6 台	6 台	09.05	
5	光伏电缆	48000m	48000m	07.19	起帆

6	低压电缆	4927 米	4927 米	08.31	
		2480 米	2480 米	08.31	Zc-YJV-0.6/1Kv-3*35+1*16mm ²
		350 米	350 米	08.31	Zc-YJV-0.6/1Kv-1x300mm ²
		1750 米	1750 米	08.31	Zc-YJV-0.6/1Kv-1*185mm ²
		347 米	347 米	08.31	Zc-YJV-0.6/1Kv-1*150mm ²
7	桥架	920 米	920 米	7.21	
	100*100	601 米	601 米		
	200*100	129 米	129 米		
	300*200	120 米	120 米		
8	接地扁铁	1800 米	1800 米	8.22	

四、后两日施工计划：

时间	计划工作内容
9.11	2 号楼交流逆变器接入，桥架盖盖板
9.12	2 号楼交流逆变器接入，桥架盖盖板

五、项目手续办理情况：项目手续办理情况

序号	项目手续	完成情况
1	项目核准批复文件/项目备案文件	完成
2	可研报告评审意见	完成
3	项目规划选址意见	无此项
4	建设用地土地预审批复	无此项
5	项目用地涉及林地情况说明	无此项


6	临时占用林地可行性研究报告（林勘报告）	无此项
7	林勘报告评审意见	无此项
8	项目接入系统方案审查意见	完成
9	送出线路可研报告	无此项
10	送出线路路径方案审批意见	无此项
11	地质灾害危险性评估报告及附图	无此项
12	矿产压覆报告	无此项
13	项目水土保持方案的批复	无此项
14	建设项目环境影响评价报告表	无此项
15	环评批复意见	无此项
16	防洪评价报告	无此项
17	并网协议	完成
18	调度命名及编号	无此项
19	并网调度协议	完成
20	供用电合同	完成
21	电价批复	无此项
22	质监报告	无此项

六、存在问题及需要协调事宜：无

七、现场照片



站班会

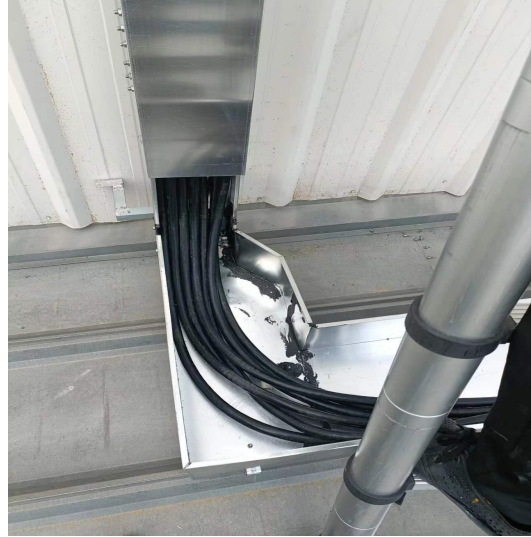

配电箱安装

每日安全交底单

编号: 1. 工程名称: 大别山风电场 2. 工程编号: 3. 日期: 2022.9.14 4. 工作地点: 5. 工作负责人: 6. 工作任务: 7. 检查工作班成员个人防护用品是否齐全(手指口述): 8. 安全技术交底内容(在作业安全风险控制卡中填写序号)

危害辨识及控制

危险源辨识: 高处作业、临时用电、机械伤害、物体打击、火灾、触电、起重伤害、坍塌、坠落、中毒、窒息、火灾、爆炸、环境污染、交通伤害、社会安全、其他。

技术交底

(1) 交代地下设施情况(包括水、电、气、油、通信等布置情况): 无

(2) 交代施工现场周边环境情况(包括建筑结构、施工现场坑洞、高处和交叉作业、危化品等危险源情况等): 施工过程中, 熟悉周边环境, 保持安全距离并由专人监护。

(3) 交代设计、施工方面的特殊要求: 无

(4) 其他: 施工工作结束, 检查无遗漏工具, 现场做好文明施工清扫工作

应急处置

(1) 交代现场发生人身安全事件的应急处置: 停止作业, 及时汇报, 进行受伤人员的急救, 做好人员的疏散。

补充完成变更安全措施(根据实际情况填写, 若无, 请划掉)

序号 作业类型(或可能存在的危害或风险) 风险预防和控制措施 执行情况(√)

交底

安全技术交底单

1. 交底人: 2. 被交底人: 3. 交底日期: 4. 交底地点: 5. 交底内容: 6. 交底人签字: 7. 被交底人签字: 8. 安全员签字: 9. 监护人签字: 10. 评价: (合格/不合格)

交底内容: 进入配电箱内检修线路, 必须停电, 验电, 挂接地线, 悬挂警示牌, 设专人监护。

评价: (合格)

交底
