

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 11 日

天气：阴

星期：三

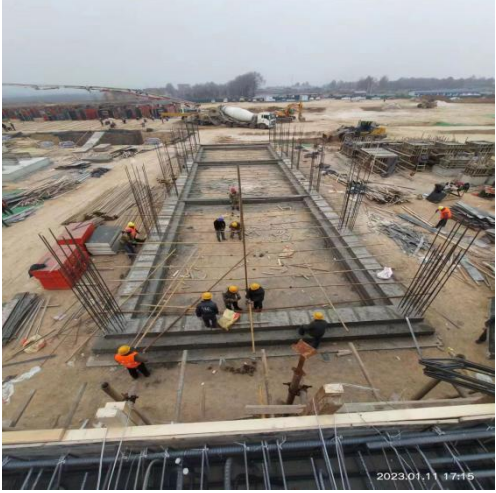
气温：-2℃ -10℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：5人；施工人员：100人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：1辆；土方车：6辆；吊车：1辆 二、今日完成情况： 1.储能预制舱基础A区1-14组侧壁板钢筋绑扎支模；A区电池预制舱基础1-7组垫层混凝土浇筑； 2.进线架构基础三七灰土换填，出线架构基础钢筋加工； 3.主控室顶板钢筋绑扎，柱模板加固； 4.事故油池防水套管安装，模板安装； 5.35KV配电室脚手架搭设； 6.安装部分： （1）主控室照明管安装。 三、明日计划： 1.出线架构基础钢筋绑扎支模，预埋螺栓安装，进线架构基础垫层支模； 2.储能预制舱基础A区1-14组仓壁钢筋绑扎，支模；A区电池预制舱1-14组基础底板钢筋绑扎； 3.主控室顶板浇筑混凝土； 4.35KV配电室脚手架搭设； 5.事故油池侧壁模板安装； 线路： 一、人员及机械配备：

		管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成60%，其中 G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G17.G18.G15.G16已浇筑完成； 2.今日完成：G1混凝土浇筑完成。 三、明日计划： 无
监 理 工 作 情 况	1.协同元工现场巡查主控室顶板钢筋施工质量； 2.现场对电池预制舱垫层混凝土进行旁站； 3.现场对G1塔基混凝土浇筑进行旁站，浇筑过程中现场未做好安全防护措施及个别 部位振捣不到位。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	主控室顶板钢筋施工	35KV 配电室脚手架搭设
照片		
文字描述	出线架构基础钢筋绑扎支模板	A 区电池预制舱基础垫层混凝土浇筑
照片		 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间：2023.01.11 17:20 天气：晴 9℃
