

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 15 日

天气：多云

星期：三

气温：3℃ -27 ℃

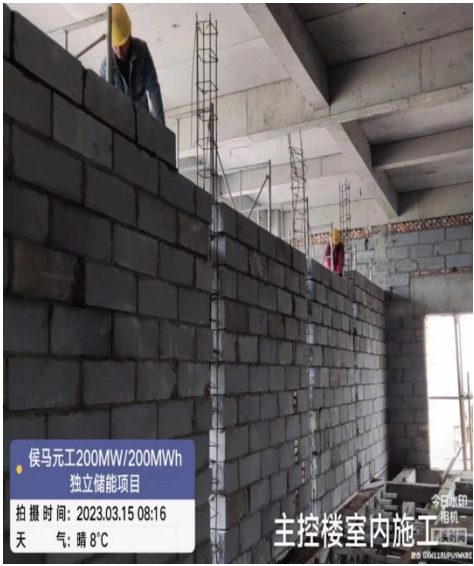
工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1.主控楼二次结构构造柱混凝土施工，室内地面找平层施工； 2.35KV配电室辅助室二次结构施工； 储能区： 1.A区、B区回填土施工，C区侧壁模板施工； 2.场平回填土施工； 3.B区电缆沟模板施工； 4.储能区到35KV辅助室电缆沟模板施工，A区到B区过路段电缆沟模板施工；主控楼到GIS电缆沟模板施工； 5.挡土墙三七灰土换填施工； 安装： 1.SVG设备安装； 2.GIS、主变到货卸货； 3.35KV盘柜到货卸车，设备就位施工； 4.电缆沟支架安装。 三、明日计划： 升压站：

	1.主控楼室内二次结构封闭砌筑施工； 2.35KV配电室二次结构封闭砌筑施工； 3.主控到GIS电缆沟模板施工； 4.场平回填土施工。 储能区： 1.B区电缆沟模板施工，C区侧壁混凝土施工； 2.挡土墙砌筑施工； 3.A区到B区过路段电缆沟模板施工，B区到C区电缆沟开挖施工。 安装： 1.SVG设备安装； 2.主变就位施工。 3.GIS设备安装施工。 4.35KV盘柜就位。 5.电缆沟支架安装。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成15基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。 2.今日完成：G17-G18封网 三、明日计划：G15-G18放线
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对GIS、主变等设备卸货进行安全检查，要求吊装作业中吊臂半径安全范围内不得存在人员。

其它事项			
本日现场监理人员			
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王宗强		

工程现场照片：

文字描述	35KV 高压柜卸货	主控楼室内施工
照片		
文字描述		
照片		
