

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 07 日

天气：多云

星期：五

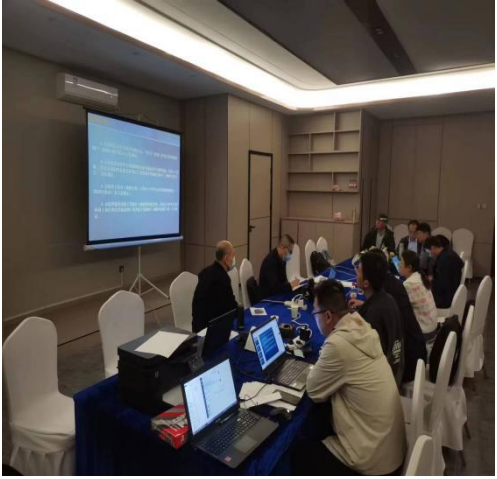
气温：3℃ -21 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：50人；安装施工人员：30人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：1辆 二、今日完成情况： 升压站： 1、电缆沟混凝土浇筑施工。 2、避雷针基础混凝土浇筑两个。 3、综合泵房钢筋加工。 4、围墙施工。 5、主控室、35KV辅助室抹灰施工。 安装： 1、电缆铺设施工。 2、电缆支架安装。 3、二次盘柜接线安装施工。 三、明日计划： 土建 1、电缆沟模板施工。 2、围墙施工。 3、主控室、35KV辅助室抹灰施工。 安装

	1、电缆铺设施工。 2、主控室、35KV辅助室设备安装施工。 3、电缆支架安装施工。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成16基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G14.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔组立完成11基：G1.G2.G3.G4.G9.G10.G11.G15.G18.G16.G17。 2.今日完成：配合进行首次及杆塔组立前阶段质量监督检查。 三、明日计划： 配合质监进行立塔前的检查工作。	
监 理 工 作 情 况	1.配合进行220KV送出线路首次及杆塔组立前阶段质量监督检查； 2.升压站现场施工过程中，要求施工单位做好隐蔽工程的影像资料。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	电缆敷设	线路首次及杆塔组立前质监检查
照片		
文字描述		
照片		
