

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 03 日

天气：小雨

星期：三

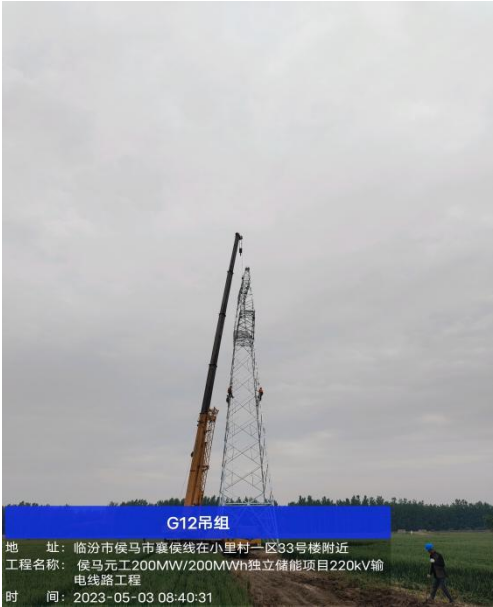
气温：23℃ -17℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况		施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员25人。安装施工人员8人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房钢筋制作。 2、综合泵房钢筋绑扎。 3、场区地面平整施工。 安装： 1、二次盘柜接线安装施工。 2、35KV高压接线施工。 三、明日计划： 土建 1、场区地面平整施工。 2、综合泵房钢筋加工。 3、综合泵房钢筋绑扎。 4、进出线架构安装施工。 安装 1、电缆铺设施工。 2、主控室、35KV辅助室设备接线施工。 线路：

		一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的45%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：12#吊装完成；1#后尾挂好；12#螺丝紧完，防风罩没装。 三、明日计划：3#挂后尾，紧线；13/14#紧螺丝。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对附属用房、东围墙圈梁模板拆除进行检查，要求施工单位加强质量管理，及时对混凝土进行养护。 2.对G12铁塔吊装组立进行安全旁站，要求施工单位加强安全管理力度，高空作业必须佩戴安全带，施工人员需正确佩戴安全帽。 3.近几天下雨频繁，施工单位需做好防雨措施，对材料、设备进行覆盖，升压站设备做好防雨防淋措施，积水地带提前做好排水工作。线路部分注意检查地锚和拉线以及卡线器安全。 4.要求施工单位尽快对施工资料查缺补漏，同时上报相关管理资料进行审查。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	G12 铁塔吊装组立	东围墙拆模施工
照片	 G12吊组 地 址：临汾市侯马市冀侯线在小里村一区33号楼附近 工程名称：侯马元工200MW/200MWh独立储能项目220kV输 电线路工程 时 间：2023-05-03 08:40:31	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 东围墙拆模施工 拍摄时间：2023.05.03 10:26 天 气：多云 18℃ 今日水印 相机 真实时间 微信 4756464383022
文字描述	回填土施工	
照片	 储能区回填土 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间：2023.05.03 09:48 天 气：多云 18℃ 今日水印 相机 真实时间 微信 4756464383022	
