

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 27 日

天气：中雨

星期：六

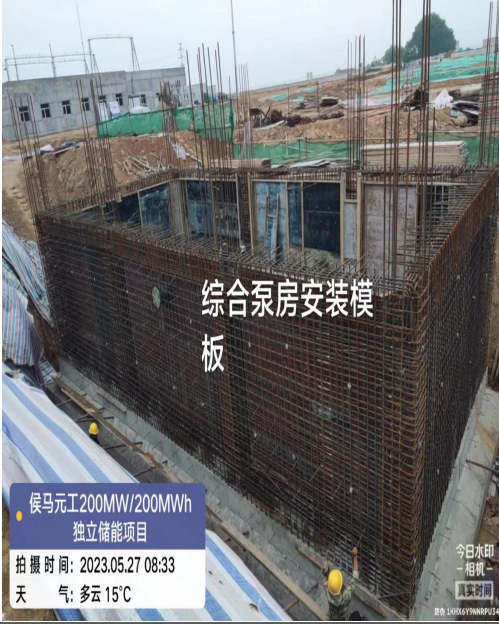
气温：21℃ -16℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内装修。 2、综合泵房水箱模板施工。 3、室外工作下雨停工。 安装 停工，等待储能设备进场。 三、明日计划： 土建 1、综合泵房水箱侧壁模板施工。 2、主控室室内装修。 安装 1、停工，等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线

		完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监理工作情况	1.因天气下雨，要求施工单位注意因下雨因素导致室外设备材料的潮湿，做好设备成品保护及防水防潮措施，电气设备及电缆头做好防雨防潮保护，雨后及时排出电缆沟内积水。 2.整理项目监理资料。	
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	综合泵房模板安装	主控楼刮白
照片	 综合泵房安装模板 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间：2023.05.27 08:33 天气：多云 15℃	 主控楼刮白施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间：2023.05.27 08:36 天气：多云 15℃
