

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 05 日

天气：多云转阴

星期: 二

气温: 27°C -16°C

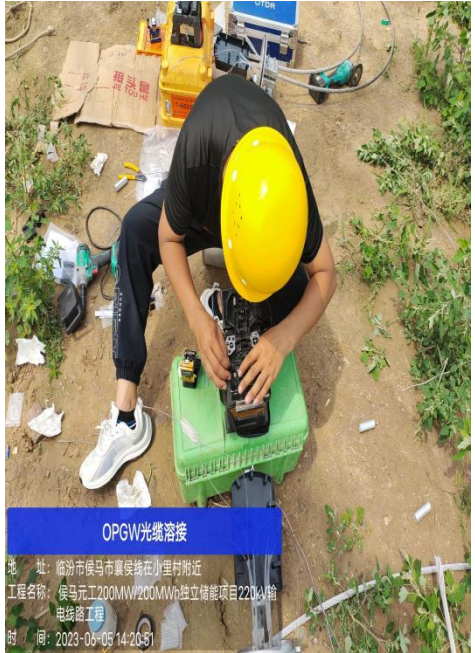
工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内装修。 2、综合泵房模板施工。 3、35KV配电室室外装修施工。 安装 停工，储能设备未到场。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内装修。 2、综合泵房模板施工。 3、35KV配电室室外装修施工。 4、附属用房封闭砌筑施工。 安装 1、停工，等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人

		二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，要求施工单位加强质量管理，加强施工工艺，并尽快上报装饰装修材料产品证明文件。 2.对线路OPGW光缆熔接进行旁站，要求施工单位待施工完成后及时对遗留的杂物清理干净。 3.整理项目监理资料。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	主控室窗户安装	主控室室内装饰装修
照片	 主控楼安装窗户 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.05 10:13 天气: 阴 18°C	 主控楼室内装饰装修 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.05 11:13 天气: 阴 20°C

文字描述	35KV 配电室外墙粉刷施工	OPGW 光缆熔接
照片	 35千伏外墙施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.05 09:47 天气: 阴 18°C 今日水印 - 相机 - 真实时间 颜色 CL72PTV901HLCD	 OPGW光缆熔接 地址: 临汾市侯马市襄侯线在小里村附近 工程名称: 侯马元工200MW/200MWh独立储能项目220kV输 电线路工程 时间: 2023-06-05 14:26:51
