

監理日志

日期：2023 年 04 月 02 日

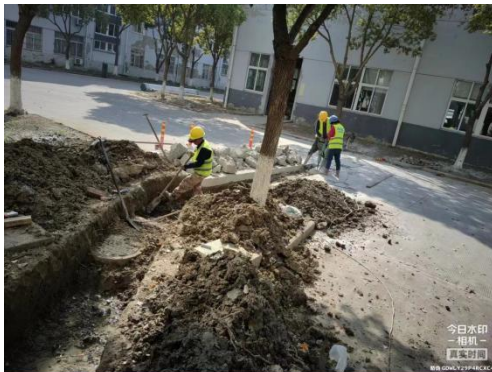
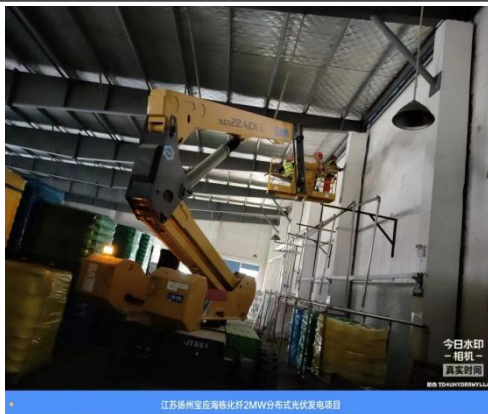
天气：晴

工程名称:江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目

气温: 14~24℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行支架安装，屋面加固、交流桥架、直流桥架安装，运维通道安装，电缆沟破路开挖，支架与支架连接处缝隙较大，已要求及时整改。	
	进度情况：常规坊车间厂房加固，成品库车间屋面导轨安装，常规坊车间屋面桥架安装，路面电缆沟破路开挖。	
	材料进场情况：支架到货 1.92MW	总量 1.92MW
	逆变器到货 32 台	总量 32 台
	中压、边压块到货 1.92MW	总量 1.92MW
	检修通道到货两个屋面	总计 2 个屋面
	桥架到货两个屋面	总计 2 个屋面
	直流线到货 10000 米	总计约 20000 米
	安全情况：施工现场个别施工人员未佩戴安全帽，工器具检查符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	江苏日晖能源工程有限公司	1、常规坊车间屋面桥架安装。 2、成品库车间屋面导轨安装。 3、路面电缆沟破路开挖。 4、常规坊车间厂房加固。
其 它 事 项	施工资料未报审。	
记录人：邱华		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

站点名称	江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/04/02
施工单位	江苏日晖能源工程有限公司	施工负责人	李立建
现场照片	 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2023.04.02 09:47 天气: 晴 14℃ 地点: 宝应县·江苏海栋化纤有限公司	 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 电缆沟破路开挖 拍摄时间: 2023.04.02 15:03 天气: 晴 22℃ 地点: 宝应县·宝应时代包装材料有限公司	
描述	支架安装	电缆沟破路开挖	
现场照片	 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 厂房加固 拍摄时间: 2023.04.02 15:12 天气: 晴 23℃ 地点: 宝应县·江苏裕众车轴科技有限公司	 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 运维通道安装 拍摄时间: 2023.04.02 15:31 天气: 晴 23℃ 地点: 宝应县·江苏海栋化纤有限公司	
描述	厂房加固	运维通道安装	
