

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 19 日

天气：晴

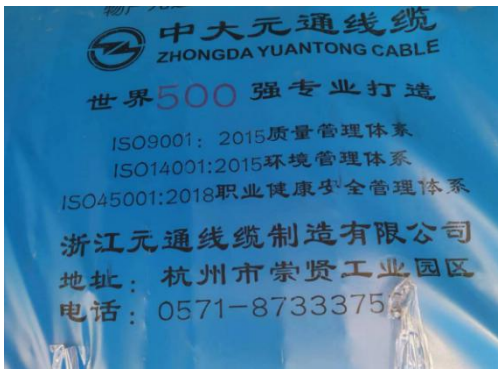
星期：星期一

气温：-2--11℃

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行并网柜基础砌砖及渣土倒运，经检查符合图纸设计要求。 加固檩条工艺不符合厂方业主及图纸设计要求下发通知单要求整改。 进度情况：1#2#并网点并网柜柜基础施工完成，厂房檩条加固调整方案中 材料进场情况：组件到货 32 箱 922 块 总量 12600 块 逆变器到货 45 台 总量 45 台 M 水槽到货 3MW 总量 5.7MW 组件支撑到货 3MW 总量 5.7MW 中边压块到货 3MW 总量 5.7MW 踏板到货两个屋面 总计 3 个屋面 直流线到货 15 盘 交流线到货 3 盘 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，工器具检查符合要求，施工区域警示标志放置到位，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点三处，现场三级配电箱配置不规范，爬梯未装护笼及屋面施工人员未佩戴安全绳未整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	2#并网柜基础砌砖及 1#并网柜基础渣土倒运 7 人 加固人员 20 人
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称:	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2022/12/19
施工单位:	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印 一相机 真实时间 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 2#配电室并网柜基础砌砖 天 气: 晴 1℃ 拍摄时间: 2022.12.19 14:01 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 杭州正衡电力工程有限公司	 今日水印 一相机 真实时间 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 3#配电室并网柜基础渣土清理 天 气: 晴 2℃ 拍摄时间: 2022.12.19 15:44 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 杭州正衡电力工程有限公司	
描述	2#配电室并网柜基础砌砖	1#配电室基础渣土倒运	
现场照片	 今日水印 一相机 真实时间 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 1#配电室基础施工 天 气: 晴 1℃ 拍摄时间: 2022.12.19 13:50 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 杭州正衡电力工程有限公司		
描述	直流线合格证	交流线厂家未见合格证	

现场照片	 国电电力康塔大和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 1#配电房基础施工 天 气: 晴 1℃ 拍 摄 时 间: 2022.12.19 13:50 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 国电电力康塔大和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 交流电缆敷设 天 气: 晴 2℃ 拍 摄 时 间: 2022.12.19 15:51 地 点: 大厂回族自治县·康泰东机械 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司
描述	直流线到货	交流线到货
