

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 25 日

天气：晴

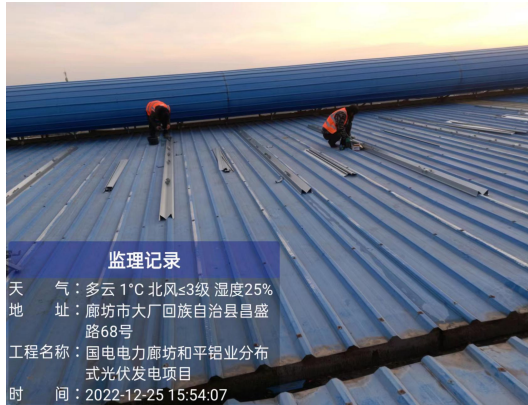
星期：星期日

气温：-3- -12℃

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行并室外电缆井施工，符合图纸设计。 进度情况：1#逆变器安装完成，厂房檩条加固完成 3 个坡面共 22 个坡面 材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块 逆变器到货 45 台 总量 45 台 M 水槽到货 3.5MW 总量 5.7MW 组件支撑到货 3.5MW 总量 5.7MW 中边压块到货 3.5MW 总量 5.7MW 踏板到货两个屋面 总计 3 个屋面 直流线到货 15 盘 交流线到货 3 盘 安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，工器具检查符合要求，施工区域采光带老化且无专用脚板，也未拉警示线或采光警示语，组件靠通道处未拉警示线，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点三处，现场三级配电箱配置不规范，爬梯未装护笼，屋面加固未拉生命线。防坠器安装到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	桥架安装 7 人，光伏支架散料 4 人，支架安装 6 人，加固人员 10 人
其 它 事 项		
记录人:胡学东		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称:	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2022/12/25
施工单位:	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 监理记录 天气: 多云 1°C 北风≤3级 湿度25% 地址: 廊坊市大厂回族自治县工业三路10号 工程名称: 国电电力廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 时间: 2022-12-25 15:56:32	 监理记录 天气: 多云 1°C 北风≤3级 湿度25% 地址: 廊坊市大厂回族自治县昌盛路68号 工程名称: 国电电力廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 时间: 2022-12-25 15:54:07	
描述	桥架安装	支架安装	
现场照片	 监理记录 天气: 多云 1°C 北风≤3级 湿度25% 地址: 廊坊市大厂回族自治县昌盛路68号 工程名称: 国电电力廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 时间: 2022-12-25 16:06:40	 监理记录 天气: 多云 1°C 北风≤3级 湿度25% 地址: 廊坊市大厂回族自治县工业三路10号 工程名称: 国电电力廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 时间: 2022-12-25 16:01:20	
描述	支架安装	气窗加固	
现场照片	 监理记录 天气: 多云 1°C 北风≤3级 湿度25% 地址: 廊坊市大厂回族自治县工业三路10号 工程名称: 国电电力廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 时间: 2022-12-25 16:00:14	 监理记录 天气: 多云 1°C 北风≤3级 湿度25% 地址: 廊坊市大厂回族自治县工业三路10号 工程名称: 国电电力廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 时间: 2022-12-25 15:55:53	
描述	屋面加固	支架散运	
