

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 27 日

天气：晴

星期：星期二

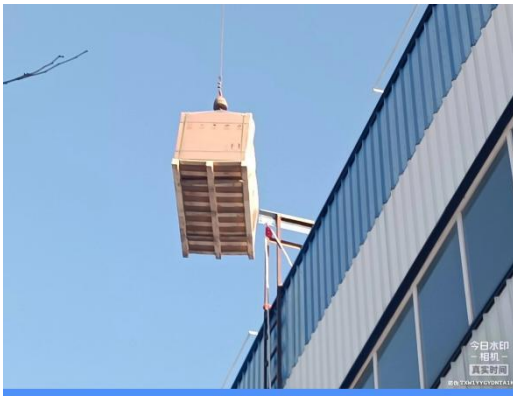
气温：1~-11℃

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行组件安装，桥架安装，屋面加固等，基本符合图纸设计要求，对不符合要求的现场立即整改。	
	进度情况：1#逆变器安装完成，厂房大檐条加固完成 4 个坡面，共 22 个坡面，组件安装约 100 块。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 3.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 3.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 3.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货两个屋面	总计 3 个屋面
施 工 情 况	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
	安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，工器具检查符合要求，施工区域采光带老化且无专用脚板，也未拉警示线或采光警示语，组件靠通道处未拉警示线，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点三处，现场三级配电箱配置不规范，电缆拖线部分无插头，爬梯未装护笼，屋面加固未拉生命线。防坠器安装到位。	
	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	桥架安装 7 人，光伏组件安装 6 人，并网柜安装 4 人，加固人员 14 人， 管理人员 1 人，现场无安全管理人员。

其它事项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人:胡学东		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称:	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2022/12/27
施工单位:	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 廊研和平铝业光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2022.12.27 09:57 天气: 晴 -3℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 常州正新电力工程咨询有限公司	 廊研和平铝业光伏发电项目 施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2022.12.27 15:14 天气: 晴 0℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 常州正新电力工程咨询有限公司	
描述	桥架安装	组件安装	
现场照片	 廊研和平铝业光伏发电项目 施工内容: 组件吊装 拍摄时间: 2022.12.27 09:10 天气: 晴 -4℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 常州正新电力工程咨询有限公司	 廊研和平铝业光伏发电项目 施工内容: 胶条粘贴 拍摄时间: 2022.12.27 09:15 天气: 晴 -4℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 常州正新电力工程咨询有限公司	
描述	组件吊装	组件贴胶条	

现场照片	 磨坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2022.12.27 14:41 天气: 晴 0℃ 监理单位: 常州正源电力工程有限公司	 磨坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2022.12.27 16:08 天气: 晴 -5℃ 监理单位: 常州正源电力工程有限公司
描述	屋面加固	垂直桥架施工
