

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 28 日

天气：晴

星期：星期三

气温：2~-10℃

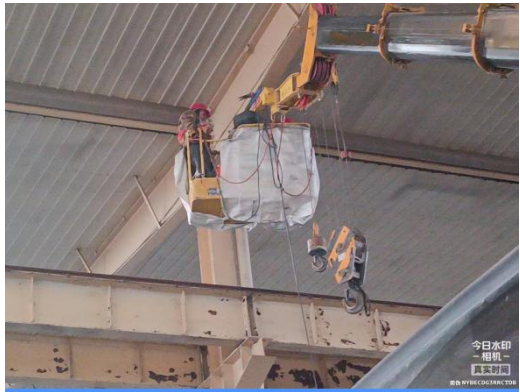
工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行组件安装，桥架安装，屋面加固等，基本符合图纸设计要求，对不符合要求的现场立即整改。	
	进度情况：1#逆变器安装完成并进行交流放线中，2#逆变器支架制作中，厂房大檐条加固完成 5 个坡面，共 22 个坡面，组件安装约 220 块。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 3.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 3.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 3.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货两个屋面	总计 3 个屋面
	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，工器具检查符合要求，施工区域采光带老化且无专用脚板，也未拉警示线或采光警示语，组件靠通道处未拉警示线，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点三处，现场三级配电箱配置不规范，部分临时用电拖线无插头，爬梯未装护笼，屋面加固未拉生命线，只放在屋面没有固定。防坠器安装到位。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	桥架安装 4 人，逆变器雨蓬安装 3 人，光伏组件安装 7 人，交流放线 12 人，加固人员 14 人，管理人员 1 人，吊蓝车一辆，现场无安全管理人员 。

其它事项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人:胡学东		审核人(签字):

工程现场照片记录表

站点名称:	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2022/12/28
施工单位:	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印相机 真实时间 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2022.12.28 10:23 天气: 晴 -3℃ 拍摄地点: 廊坊和平铝业光伏发电项目	 今日水印相机 真实时间 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2022.12.28 10:14 天气: 晴 -3℃ 拍摄地点: 大厂回族自治县, 和平铝业大厂基地	
描述	桥架安装	组件安装	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 电缆敷设 拍摄时间: 2022.12.28 10:03 天气: 晴 -3℃ 拍摄地点: 廊坊和平铝业光伏发电项目	 今日水印相机 真实时间 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 线管敷设 拍摄时间: 2022.12.28 10:19 天气: 晴 -3℃ 拍摄地点: 大厂回族自治县, 和平铝业大厂基地	
描述	组件吊装	线管敷设	

现场照片	 今日水印 相机 WEB CAMERAS APP 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 屋面加固 拍摄时间: 2022.12.28 09:56 天气: 晴 -4℃ 拍摄单位: 常州正南电力工程运维有限公司 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地	 今日水印 相机 WEB CAMERAS APP 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2022.12.28 10:12 天气: 晴 -3℃ 拍摄单位: 常州正南电力工程运维有限公司 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地
描述	屋面加固	支架安装
