

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 31 日

天气：晴

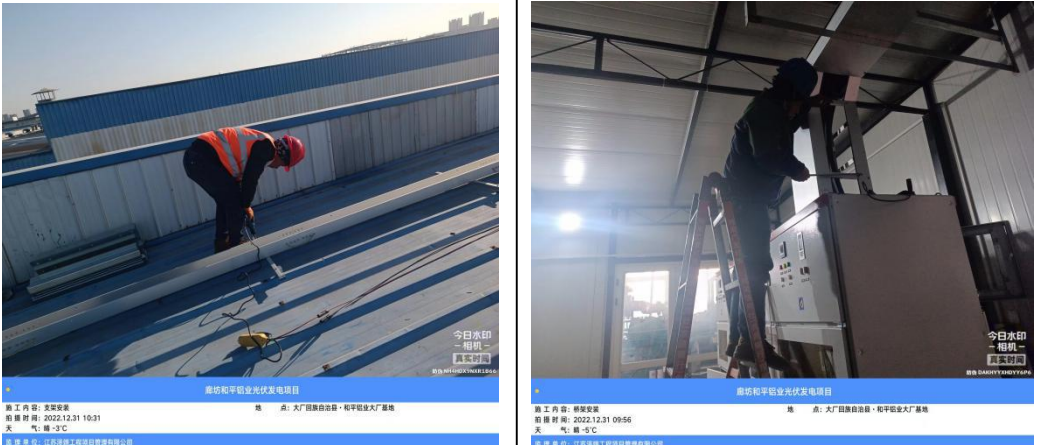
工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

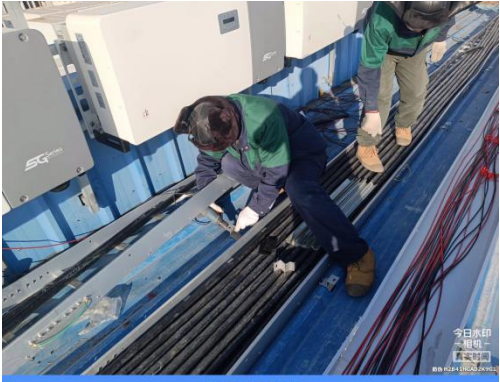
气温：4~-12℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行组件支架及组件安装，屋面加固、交流桥架、直流桥架支架安装，根据设计图纸，桥架支架为铝轨，现场所用是角铁，且是冷镀锌，已发通知单要求整改。	
	进度情况：一号屋面加固基本完成，三号屋面檩条加固中，共 22 个坡面，组件安装累计约 520 块。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 3.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 3.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 3.5MW	总量 5.7MW
施 工 情 况	踏板到货两个屋面	总计 3 个屋面
	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
	安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，工器具检查符合要求，施工区域采光带老化且无专用脚板，也未拉警示线或采光警示语，组件靠通道处未拉警示线，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点三处，现场三级配电箱配置不规范，部分临时用电拖线无插头，爬梯未装护笼，屋面加固未拉生命线，只放在屋面没有固定。防坠器安装到位。	
	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	桥架支架施工 8 人，光伏组件贴胶条、搬运、安装 7 人，屋面加固人员 14 人，管理人员 1 人，升降车一辆，现场无专职安全管理人员。

其它事项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。		
记录人:胡学东		审核人(签字):	

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2022/12/30
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片			
描述	檩条加固		组件安装
现场照片			
描述	桥架安装		桥架安装加固

现场照片	 照片信息: 2022.12.31 10:07 天气: 晴 -5℃ 拍摄地点: 山东济南 项目名称: 临沂和平铝业光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 地点: 大厂自备电站、和平铝业大厂基地 监理单位: 江苏华信工程监理有限公司
描述	桥架敷设
 照片信息: 2022.12.31 10:15 天气: 晴 -4℃ 拍摄地点: 山东济南 项目名称: 临沂和平铝业光伏发电项目 施工内容: 支架安装 地点: 大厂自备电站、大厂自备电站 监理单位: 江苏华信工程监理有限公司	支架安装
