

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 04 日

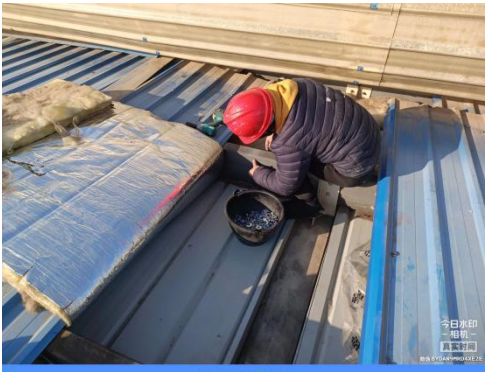





天气：晴

工程名称：国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

气温：4~-9℃

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：今日现场主要进行 2#逆变器终端铜鼻子制作安装，3#屋面桥架支架安装，组件支架及组件安装，3#屋面加固。组件安装问题未见整改，也未回复。</p> <p>进度情况：一号屋面加固完成，三号屋面檩条加固中，共 22 个坡面，施工质量良好，组件安装完成一个屋面，累计完成组件和金属板 900 余块。</p> <p>材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块</p> <table><tr><td>逆变器到货 45 台</td><td>总量 45 台</td></tr><tr><td>M 水槽到货 3.5MW</td><td>总量 5.7MW</td></tr><tr><td>组件支撑到货 3.5MW</td><td>总量 5.7MW</td></tr><tr><td>中边压块到货 3.5MW</td><td>总量 5.7MW</td></tr><tr><td>踏板到货两个屋面</td><td>总计 3 个屋面</td></tr><tr><td>直流线到货 15 盘</td><td></td></tr><tr><td>交流线到货 3 盘</td><td></td></tr></table> <p>安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，工器具检查符合要求，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点三处，现场三级配电箱配置不规范，爬梯未装护笼，屋面加固未拉生命线，只放在屋面没有固定。防坠器安装到位，目前施工队要在项目上过过年，已要求尽快落实管理人员到位，并尽快进行扶梯安装。</p>		逆变器到货 45 台	总量 45 台	M 水槽到货 3.5MW	总量 5.7MW	组件支撑到货 3.5MW	总量 5.7MW	中边压块到货 3.5MW	总量 5.7MW	踏板到货两个屋面	总计 3 个屋面	直流线到货 15 盘		交流线到货 3 盘	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台														
M 水槽到货 3.5MW	总量 5.7MW															
组件支撑到货 3.5MW	总量 5.7MW															
中边压块到货 3.5MW	总量 5.7MW															
踏板到货两个屋面	总计 3 个屋面															
直流线到货 15 盘																
交流线到货 3 盘																
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容														
	浙江阳明 电力建设 有限公司	桥架施工逆变器安装 8 人，光伏组件贴胶条、搬运、安装 7 人，屋面加固人员 14 人，管理人员 1 人，升降车一辆，现场无专职安全管理人员。														
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单五份未回复。															
记录人：胡学东		审核人（签字）：														

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/01/04
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 <p>今日水印 相机 真实时间 15:03:22</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 檩条加固 拍摄时间: 2023.01.04 15:03 天气: 晴 4℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 江苏泽隆工程建设项目管理有限公司</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间 14:49:22</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2023.01.04 14:49 天气: 晴 4℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 江苏泽隆工程建设项目管理有限公司</p>	
描述	檩条加固	组件安装	
现场照片	 <p>今日水印 相机 真实时间 15:11:11</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2023.01.04 15:11 天气: 晴 4℃ 地点: 未获取 监理单位: 江苏泽隆工程建设项目管理有限公司</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间 15:07:09</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 檩条钻孔 拍摄时间: 2023.01.04 15:07 天气: 晴 4℃ 地点: 未获取 监理单位: 江苏泽隆工程建设项目管理有限公司</p>	
描述	桥架支架安装	檩条钻孔	
现场照片	 <p>今日水印 相机 真实时间 14:40:46</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 逆变终端制作 拍摄时间: 2023.01.04 14:40 天气: 晴 4℃ 地点: 大厂回族自治县·大厂机电车棚基地 监理单位: 江苏泽隆工程建设项目管理有限公司</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间 14:51:04</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2023.01.04 14:51 天气: 晴 4℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 江苏泽隆工程建设项目管理有限公司</p>	
描述	逆变终端制作安装	支架安装	

