

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 05 日

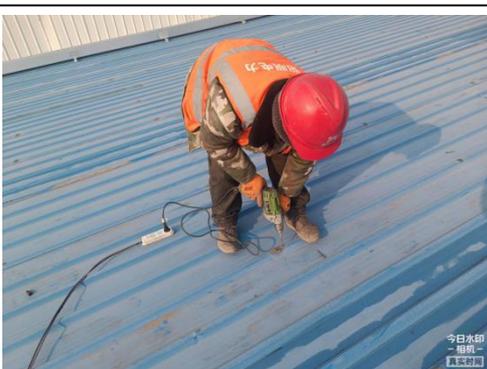
天气：晴

工程名称：国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

气温：5~-8℃

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：今日现场主要进行 3#逆变器及 2#配电房终端铜鼻子制作安装，3#屋面桥架安装，1#屋面组件安装收尾及整改，3#屋面加固及采光换置。组件直流套管安装人员个人走组件板上过屋面，已汇报建设方，建设单位授权罚款一万元。</p> <p>进度情况：一号屋面加固完成，三号屋面檩条加固中，二号屋面采光板大部分完成，施工质量良好，组件安装完成一个屋面。</p> <p>材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块</p> <p> 逆变器到货 45 台 总量 45 台</p> <p> M 水槽到货 3.5MW 总量 5.7MW</p> <p> 组件支撑到货 3.5MW 总量 5.7MW</p> <p> 中边压块到货 3.5MW 总量 5.7MW</p> <p> 踏板到货两个屋面 总计 3 个屋面</p> <p> 直流线到货 15 盘</p> <p> 交流线到货 3 盘</p> <p>安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，施工器具检查符合要求，目前施工队要在项目上过年，已要求尽快落实安全质量管理人员到位，并尽快进行扶梯安装，确保质量合格，安全生产正常。</p>	
	施 工 情 况	施 工 单 位
	浙江阳明 电力建设 有限公司	桥架施工逆变器安装 8 人，光伏组件贴胶条、搬运、安装 7 人，屋面加固人员 14 人，管理人员 1 人，升降车一辆，现场无专职安全管理人员。
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单五份未回复。	
记录人：胡学东		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/01/05
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 <p>今日水印相机 真实时间 2023/01/05 10:47</p> <p>施工内容: 檩条加固 拍摄时间: 2023.01.05 10:47 天气: 晴 -3℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 设备型号: 江苏泽鸿工程摄影器材有限公司</p>	 <p>今日水印相机 真实时间 2023/01/05 10:54</p> <p>施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2023.01.05 10:54 天气: 晴 -3℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 设备型号: 江苏泽鸿工程摄影器材有限公司</p>	
描述	檩条加固	组件安装	
现场照片	 <p>今日水印相机 真实时间 2023/01/05 10:37</p> <p>施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2023.01.05 10:37 天气: 晴 -3℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 设备型号: 江苏泽鸿工程摄影器材有限公司</p>	 <p>今日水印相机 真实时间 2023/01/05 10:43</p> <p>施工内容: 檩条钻孔 拍摄时间: 2023.01.05 10:43 天气: 晴 -3℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 设备型号: 江苏泽鸿工程摄影器材有限公司</p>	
描述	桥架安装	檩条钻孔	
现场照片	 <p>今日水印相机 真实时间 2023/01/05 10:39</p> <p>施工内容: 电缆制作 拍摄时间: 2023.01.05 10:39 天气: 晴 -3℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 设备型号: 江苏泽鸿工程摄影器材有限公司</p>	 <p>今日水印相机 真实时间 2023/01/05 10:42</p> <p>施工内容: 彩钢加固 拍摄时间: 2023.01.05 10:42 天气: 晴 -3℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 设备型号: 江苏泽鸿工程摄影器材有限公司</p>	
描述	逆变终端制作安装	彩钢加固	

