

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 07 日

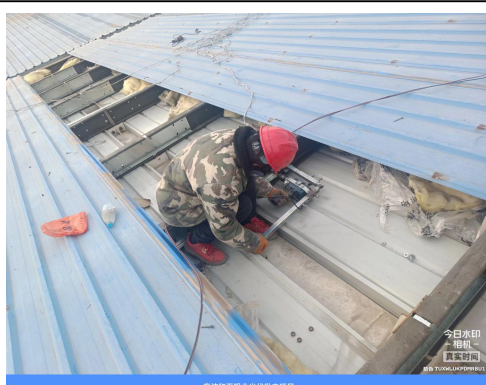
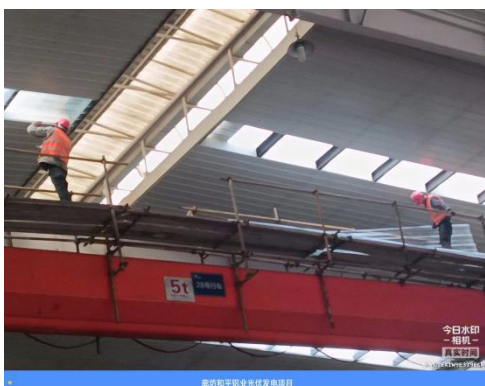
天气：晴

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

气温：6~-7℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行 3#屋面加固、组件支架搬运、安装，施工质量良好，桥架安装符合要求，3#屋面加固及采光换置施工质量正常。 进度情况：一号屋面加固全部完成，一个屋面组件完成，一、二号逆变、并网柜终端制作安装完成，三号屋面檩条加固及光伏支架正在施工中，逆变终端制作安装完成，二号屋面采光板大部分完成，三号采光完成。 材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块 逆变器到货 45 台 总量 45 台 M 水槽到货 3.5MW 总量 5.7MW 组件支撑到货 3.5MW 总量 5.7MW 中边压块到货 3.5MW 总量 5.7MW 踏板到货两个屋面 总计 3 个屋面 直流线到货 15 盘 交流线到货 3 盘 安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，施工器具检查符合要求，目前施工队要在项目上过年，已要求尽快落实安全质量管理人员到位，上楼扶梯安装即将完成待检。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	桥架施工、搬运 2 人，光伏支架搬运安装 7 人，屋面加固人员 14 人，材料吊装 4 人，管理人员 1 人，吊车一辆，升降车两辆，现场无专职安全管理人员 。
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单六份待回复。	
记录人:胡学东		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/01/06
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2023/01/07 10:10 天气: 多云-2℃ 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 材料吊装 拍摄时间: 2023.01.07 10:10 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 建设单位: 江苏泽海工程建设项目管理有限公司		 今日水印相机 真实时间 2023/01/07 09:55 天气: 多云-2℃ 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 材料吊装及安装 拍摄时间: 2023.01.07 09:55 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 建设单位: 江苏泽海工程建设项目管理有限公司	
描述	材料吊装		支架搬运	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2023/01/07 10:03 天气: 多云-2℃ 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 屋面加固 拍摄时间: 2023.01.07 10:03 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 建设单位: 江苏泽海工程建设项目管理有限公司		 今日水印相机 真实时间 2023/01/07 10:00 天气: 多云-2℃ 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 屋面加固 拍摄时间: 2023.01.07 10:00 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 建设单位: 江苏泽海工程建设项目管理有限公司	
描述	檩条加固		檩条钻孔	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2023/01/07 09:35 天气: 多云-3℃ 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 采光置换 拍摄时间: 2023.01.07 09:35 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 建设单位: 江苏泽海工程建设项目管理有限公司		 今日水印相机 真实时间 2023/01/07 09:35 天气: 多云-3℃ 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 采光置换 拍摄时间: 2023.01.07 09:35 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 建设单位: 江苏泽海工程建设项目管理有限公司	
描述	采光置换		支架拆除	

