

# 监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 08 日

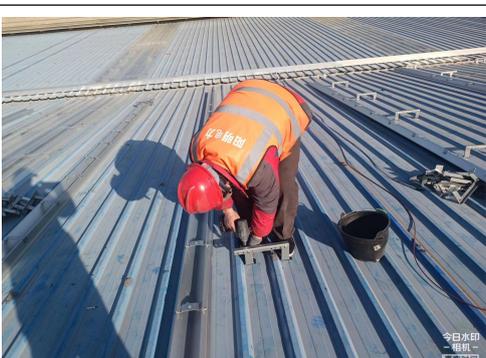
天气：晴

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

气温：6~-7℃

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：今日现场主要进行 3#屋面加固、组件支架安装，组件施工未进行接地连接，桥架安装符合要求，3#屋面加固及采光换置施工质量正常。</p> <p>进度情况：一号屋面加固全部完成，一个屋面组件完成未验收，一、二号、三号逆变、并网柜终端制作安装完成，三号屋面檩条加固及光伏支架正在施工中，二号屋面采光板大部分完成，屋面未加固，三号采光完成。</p> <p>材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块</p> <p>                  逆变器到货 45 台 总量 45 台</p> <p>                  M 水槽到货 3.5MW 总量 5.7MW</p> <p>                  组件支撑到货 3.5MW 总量 5.7MW</p> <p>                  中边压块到货 3.5MW 总量 5.7MW</p> <p>                  踏板到货两个屋面 总计 3 个屋面</p> <p>                  直流线到货 15 盘</p> <p>                  交流线到货 3 盘</p> <p>安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，施工器具检查符合要求，目前施工队要在项目上过年，已要求尽快落实安全质量管理人员到位，上楼扶梯安装即将完成，保与外墙钢板连接是用的自攻螺丝没有拉力，容易松动和剪断，不符合强条、规范要求。</p>	
	施 工 情 况	施 工 单 位
	浙江阳明 电力建设 有限公司	桥架施工、搬运 2 人，光伏组件支架搬运安装 7 人，屋面加固人员 14 人，材料吊装 4 人，管理人员 1 人，吊车一辆，升降车两辆，现场无专职安全管理人员。
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单六份待回复。	
记录人：胡学东		审核人（签字）：

## 工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/01/08
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 <p>今日水印 相机 真实时间 水印 PHOTOSIMPLA</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目</p> <p>施工内容: 材料吊装 拍摄时间: 2023.01.08 10:09 天气: 晴 0℃</p> <p>地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地</p> <p>监理单位: 江苏海隆工程监理咨询有限公司</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间 水印 PHOTOSIMPLA</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目</p> <p>施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2023.01.08 10:12 天气: 晴 0℃</p> <p>地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地</p> <p>监理单位: 江苏海隆工程监理咨询有限公司</p>	
描述	材料吊装	组件安装	
现场照片	 <p>今日水印 相机 真实时间 水印 PHOTOSIMPLA</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目</p> <p>施工内容: 檩条加固 拍摄时间: 2023.01.08 10:10 天气: 晴 0℃</p> <p>地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地</p> <p>监理单位: 江苏海隆工程监理咨询有限公司</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间 水印 PHOTOSIMPLA</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目</p> <p>施工内容: 檩条钻孔 拍摄时间: 2023.01.08 10:18 天气: 晴 0℃</p> <p>地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地</p> <p>监理单位: 江苏海隆工程监理咨询有限公司</p>	
描述	檩条加固	檩条钻孔	
现场照片	 <p>今日水印 相机 真实时间 水印 PHOTOSIMPLA</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目</p> <p>施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2023.01.08 10:15 天气: 晴 0℃</p> <p>地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地</p> <p>监理单位: 江苏海隆工程监理咨询有限公司</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间 水印 PHOTOSIMPLA</p> <p>廊坊和平铝业光伏发电项目</p> <p>施工内容: 走道安装 拍摄时间: 2023.01.08 10:13 天气: 晴 0℃</p> <p>地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地</p> <p>监理单位: 江苏海隆工程监理咨询有限公司</p>	
描述	支架安装	走道安装	

