

監理日志

日期：2023 年 01 月 09 日

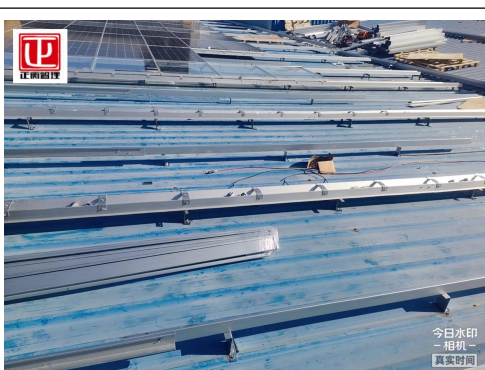
天气：晴

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

气温: $7 \sim -6^{\circ}\text{C}$

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行组件支架安装，组件施工未进行接地连接，桥架安装符合要求，2#3#并网点停电改造。	
	进度情况：1#3#屋面加固完成，组件安装完成 1060 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 3.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 3.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 3.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货两个屋面	总计 3 个屋面
	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
	安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，施工器具检查符合要求，，上楼扶梯安装完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	光伏组件支架搬运安装 9 人，屋面加固人员 8 人，材料吊装 4 人，管理人员 1 人，吊车一辆，升降车两辆，现场无专职安全管理人员 。
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单六份待回复。	
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/01/09
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	戚越
现场照片	 廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：二号并网柜停电改造 拍 摄 时 间：2023.01.09 10:11 天 气：多云 2℃ 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：常州正泰电力工程有限公司		 廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号逆变器附件安装 拍 摄 时 间：2023.01.09 12:45 天 气：多云 7℃ 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：常州正泰电力工程有限公司	
描述	2#并网总柜接线		组件安装	
现场照片	 廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号点并网柜停电改造 拍 摄 时 间：2023.01.09 18:22 天 气：晴 2℃ 地 点：大厂回族自治县·天兴楼 监 理 单 位：常州正泰电力工程有限公司		 廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号点并网柜停电改造 拍 摄 时 间：2023.01.09 15:58 天 气：晴 8℃ 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：常州正泰电力工程有限公司	
描述	总柜对端接线		4#总柜接线	
现场照片	 廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号排水槽安装 拍 摄 时 间：2023.01.09 13:13 天 气：多云 7℃ 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：常州正泰电力工程有限公司		 廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号点并网柜停电改造 拍 摄 时 间：2023.01.09 15:37 天 气：晴 8℃ 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：常州正泰电力工程有限公司	
描述	导水槽安装		5#总柜接线	

