

# 监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 18 日

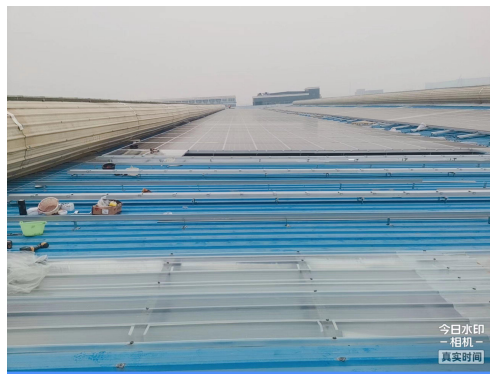
天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：4~-6℃

|                            |                                                                              |                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 质量情况：组件密封胶条安装位置已改正符合图纸设计，施工人员进行采光带损坏修复防止漏水。                                  |                                                   |
|                            | 进度情况：1#3#屋面加固完成，组件安装完成 3800 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。 |                                                   |
|                            | 材料进场情况：组件到货 12600 块      总量 12600 块                                          |                                                   |
|                            | 逆变器到货 45 台                                                                   | 总量 45 台                                           |
|                            | M 水槽到货 5.5MW                                                                 | 总量 5.7MW                                          |
|                            | 组件支撑到货 5.5MW                                                                 | 总量 5.7MW                                          |
|                            | 中边压块到货 5.5MW                                                                 | 总量 5.7MW                                          |
|                            | 踏板到货三个车间                                                                     | 总计 3 个车间                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 直流线到货 15 盘                                                                   |                                                   |
|                            | 交流线到货 3 盘                                                                    |                                                   |
|                            | 安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成，采光带防护不到位运货通道未搭建，光伏线逆变器处防护不到位。    |                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                         | 施工内容                                              |
|                            | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                         | 今日现场施工人员约 34 人，分 6 个安装队伍，约完成组件安装 100 块。<br>檩条加固五人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。                                      |                                                   |
| 记录人:杨铃铃                    |                                                                              | 审核人（签字）:                                          |

## 工程现场照片记录表

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 站点名称 | 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目                                                                                                                                                                                                                                                | 巡检日期                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2023/02/17 |
| 施工单位 | 浙江阳明电力建设有限公司                                                                                                                                                                                                                                                         | 施工负责人                                                                                                                                                                                                                                                                        | 戚越         |
| 现场照片 | <div><p>今日水印<br/>相机<br/>真实时间</p><p>廊坊和平铝业分布式光伏发电项目</p><p>工 序：一号屋面北一二组件安装进度<br/>拍 摄 时 间：2023.02.18 10:43<br/>天 气：重慶霧霾 2℃<br/>地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地<br/>摄 像 单 位：江苏泽瑞工程管理有限公司</p></div> | <div><p>今日水印<br/>相机<br/>真实时间</p><p>廊坊和平铝业分布式光伏发电项目</p><p>工 序：三号屋面北三组件安装基本完成<br/>拍 摄 时 间：2023.02.18 10:17<br/>天 气：重慶霧霾 1℃<br/>地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地<br/>摄 像 单 位：江苏泽瑞工程管理有限公司</p></div>       |            |
| 描述   | 一号屋面北三四安装进度                                                                                                                                                                                                                                                          | 三号北三四安装即将完成                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 现场照片 | <div><p>今日水印<br/>相机<br/>真实时间</p><p>廊坊和平铝业分布式光伏发电项目</p><p>工 序：三号屋面北四组件安装<br/>拍 摄 时 间：2023.02.18 10:02<br/>天 气：重慶霧霾 1℃<br/>地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地<br/>摄 像 单 位：江苏泽瑞工程管理有限公司</p></div>   | <div><p>今日水印<br/>相机<br/>真实时间</p><p>廊坊和平铝业分布式光伏发电项目</p><p>工 序：三号屋面南三组件安装基本完成<br/>拍 摄 时 间：2023.02.18 10:27<br/>天 气：重慶霧霾 1℃<br/>地 点：大厂回族自治县·中国铝业大厂智能硬件产业园<br/>摄 像 单 位：江苏泽瑞工程管理有限公司</p></div> |            |
| 描述   | 三号屋面北四组件安装                                                                                                                                                                                                                                                           | 三号屋面南三组件安装                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
