

監理日志

日期：2023 年 02 月 19 日

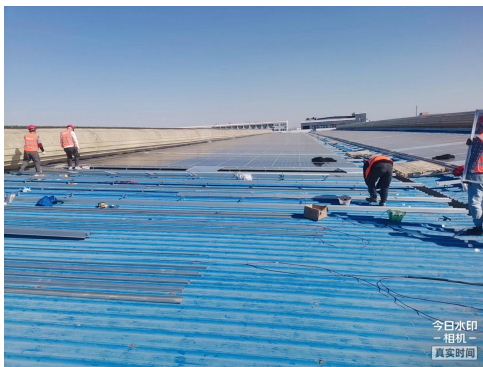
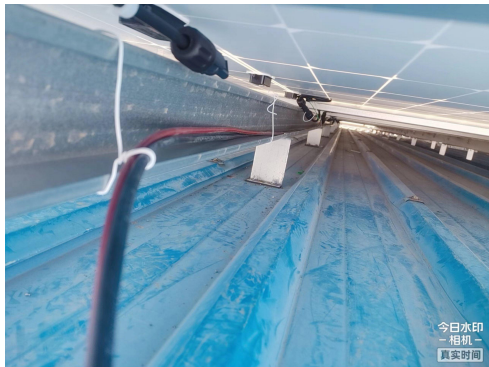
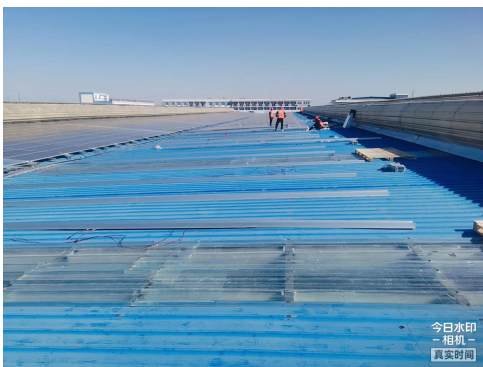
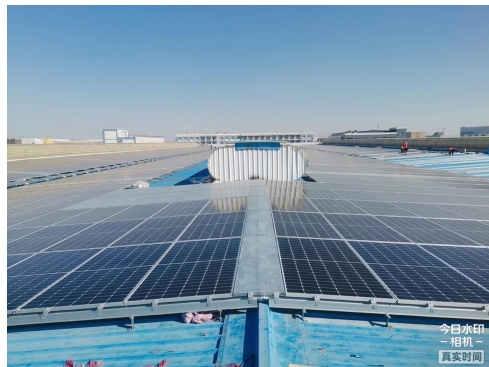
天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：9~-4℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：支架安装组件安装符合图纸设计，施工人员进行采光带损坏修复防止漏水。	
	进度情况：1#3#屋面加固完成，组件安装完成 4000 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 5.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 5.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 5.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货三个车间	总计 3 个车间
施 工 情 况	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
其 它 事 项	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成，采光带防护不到位运货通道未搭建，光伏线逆变器处防护不到位。	
	施工单位	施工内容
施 工 情 况	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约 34 人，分 6 个安装队伍，约完成组件安装 200 块。 檩条加固五人
	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。	
记录人:杨铃铃		
审核人（签字）:		

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/02/19
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 三号屋面南三组件安装 天 气: 晴 9℃ 拍 摄 时 间: 2023.02.19 13:42 地 点: 大厂回族自治县·冀南国际文化科技传媒产业园 监 理 单 位: 江苏泽瑞工程管理有限公司  今日水印相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 三号屋面光伏电缆绑扎检查 天 气: 晴 9℃ 拍 摄 时 间: 2023.02.19 13:44 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 江苏泽瑞工程管理有限公司			
描述	三号屋面南三组件安装		光伏线绑扎检查	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 三号屋面南四组件安装 天 气: 晴 9℃ 拍 摄 时 间: 2023.02.19 13:45 地 点: 大厂回族自治县·冀南国际文化科技传媒产业园 监 理 单 位: 江苏泽瑞工程管理有限公司  今日水印相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 三号屋面北三四组件安装完成 天 气: 晴 9℃ 拍 摄 时 间: 2023.02.19 13:51 地 点: 大厂回族自治县·天津路 监 理 单 位: 江苏泽瑞工程管理有限公司			
描述	三号屋面南四组件安装		三号屋面北三四组件安装完成	
