

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 21 日

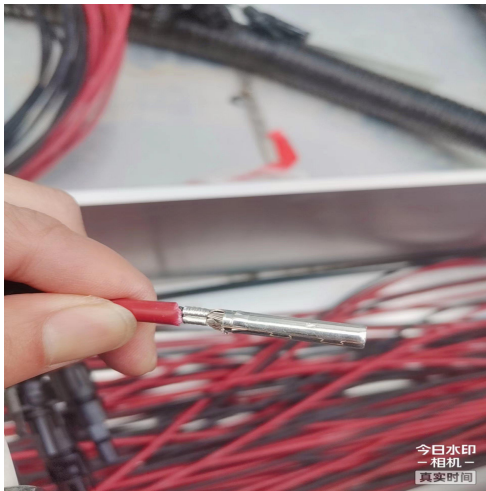
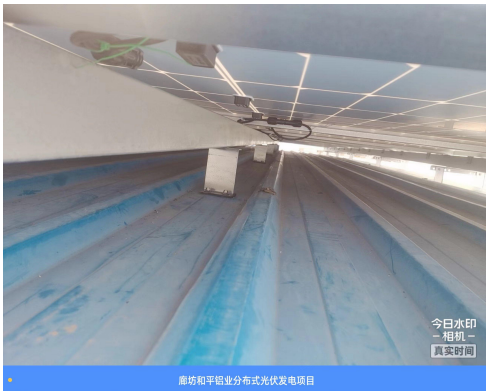
天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：5~-7℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：光伏线 MC4 插头压接不实，组件摆放不规范易划伤，组件胶条安装不规范现场通知施工方整改，下午复查基本整改完成。	
	进度情况：1#3#屋面加固完成，组件安装完成 4400 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 5.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 5.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 5.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货三个车间	总计 3 个车间
施 工 情 况	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成，采光带防护不到位运货通道未搭建，光伏线逆变器处防护不到位。	
其 它 事 项	施工单位	施工内容
	浙江阳明	今日现场施工人员约 34 人，分 6 个安装队伍，约完成组件安装 400 块。
	电力建设 有限公司	
无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。		
记录人:邱华		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/02/22
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: mc4插头压接检 天 气: 多云 0°C 查 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 拍 摄 时 间: 2023.02.21 10:16 监 理 单 位: 江苏泽翎工程管理有限公司	 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 三号屋面组件最后安装 天 气: 多云 0°C 拍 摄 时 间: 2023.02.21 10:21 地 点: 大厂回族自治县·天兴楼 监 理 单 位: 江苏泽翎工程管理有限公司	
描述	MC4 插头制作检查	组件安装	
现场照片	 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 光伏线绑扎检查 天 气: 多云 0°C 拍 摄 时 间: 2023.02.21 10:32 地 点: 大厂回族自治县·康平空调 监 理 单 位: 江苏泽翎工程管理有限公司	 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 施工人员进行安全培训 天 气: 多云 0°C 拍 摄 时 间: 2023.02.21 10:59 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 江苏泽翎工程管理有限公司	
描述	光伏线绑扎检查	安全培训	
