

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 02 日

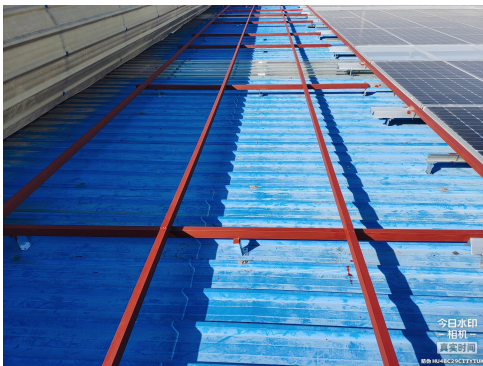
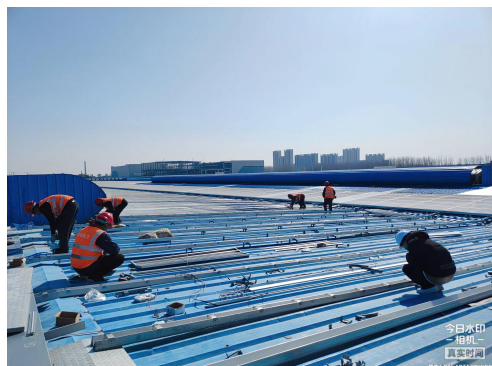
天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：16~-2℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：1#、2#屋面组件边压块安装不规范；3#屋面上包边支架防锈底漆粉刷不符合要求（已现场重新粉刷）；2#屋面 MC4 插头绑扎不规范（已现场整改）。	
	进度情况：屋面加固完成，组件安装完成 10000 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 5.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 5.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 5.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货三个车间	总计 3 个车间
施 工 情 况	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成，采光带防护不到位运货通道未搭建，光伏线逆变器处防护不到位。	
其 它 事 项	施工单位	施工内容
	浙江阳明	今日现场施工人员约 48 人，分 6 个安装队伍，约完成组件安装 1000 块。
	电力建设 有限公司	
无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。		
记录人:邱华		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/03/02
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 河北廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 2#厂房组件及排水槽安装 天 气: 晴 7℃ 拍 摄 时 间: 2023.03.02 10:54 地 点: 大厂回族自治县·祥福佳苑 监 理 单 位: 江苏泽翔工程管理有限公司	 河北廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 2#厂房监控固定 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 拍 摄 时 间: 2023.03.02 16:10 天 气: 晴 14℃ 监 理 单 位: 江苏泽翔工程管理有限公司	
描述	二号屋面组件及排水槽安装	描述	二号屋面监控固定
现场照片	 河北廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 3#厂房上包边支架防锈底漆粉刷 天 气: 晴 5℃ 拍 摄 时 间: 2023.03.02 10:07 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 江苏泽翔工程管理有限公司	 河北廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 1#厂房组件及排水槽安装 天 气: 晴 6℃ 拍 摄 时 间: 2023.03.02 10:45 地 点: 大厂回族自治县·祥福佳苑 监 理 单 位: 江苏泽翔工程管理有限公司	
描述	三号屋面上包边支架防锈底漆粉刷	描述	一号屋面排水槽安装
