

監理日志

日期：2023 年 03 月 03 日

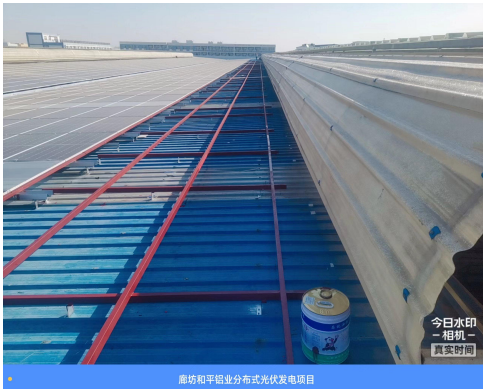
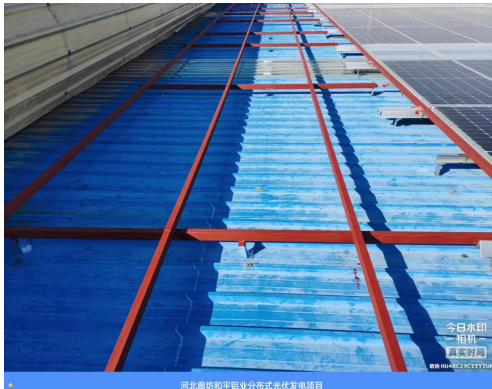
天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温: $18 \sim -4^{\circ}\text{C}$

监 理 工 作 情 况	质量情况：1#屋面组件间隙过大中压块不严密已现场提出整改明日复查，组件上包边支架防腐不均匀有漏刷现场，现场要求二次粉刷验收后进行彩钢瓦盖板，桥架支架不符合图纸设计要求。	
	进度情况：屋面加固完成，组件安装完成 11000 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台 总量 45 台	
	M 水槽到货 5.5MW 总量 5.7MW	
	组件支撑到货 5.5MW 总量 5.7MW	
	中边压块到货 5.5MW 总量 5.7MW	
	踏板到货三个车间 总计 3 个车间	
	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
施 工 情 况	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成，采光带防护不到位运货通道未搭建，光伏线逆变器处防护不到位。	
	施工单位	施工内容
其 它 事 项	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约 48 人，分 6 个安装队伍，约完成组件安装 1000 块。
	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。	
记录人：邱华		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/03/03
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：组件上包边安装防腐漆 拍 摄 时 间：2023.03.03 10:14 天 气：晴 6℃ 地 点：大厂回族自治县·中国智能光伏产业示范基地 监 理 单 位：江苏泽锦工程管理有限公司	 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：3#厂房上包边安装防腐漆 拍 摄 时 间：2023.03.02 10:07 天 气：晴 5℃ 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：江苏泽锦工程管理有限公司	
描述	组件上包边施工	组件上包边施工	
现场照片	 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：组件上包边安装防腐漆检查 拍 摄 时 间：2023.03.03 10:21 天 气：晴 6℃ 地 点：大厂回族自治县·中国智能光伏产业示范基地 监 理 单 位：江苏泽锦工程管理有限公司	 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：桥架支架检查 拍 摄 时 间：2023.03.03 10:22 天 气：晴 6℃ 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：江苏泽锦工程管理有限公司	
描述	组件上包边防腐检查	桥架支架检查	
