

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 23 日

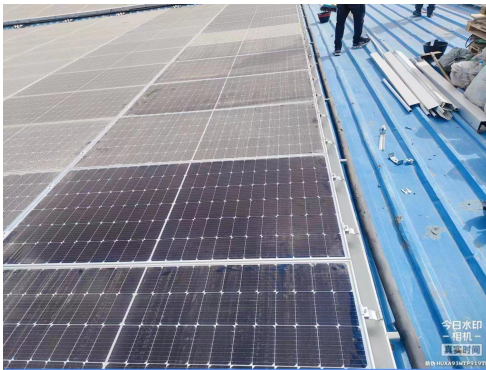
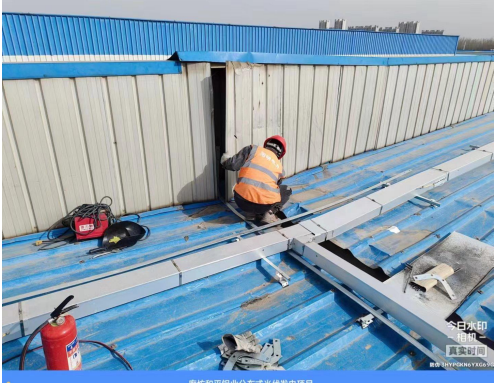
天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：15~7℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：组件下包边施工中，组件接地电阻测试满足图纸设计要求。	
	进度情况：屋面加固完成，组件安装完成 11980 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 5.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 5.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 5.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货三个车间	总计 3 个车间
	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约 12 人，组件下包边及方阵临边彩钢瓦铺设。
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。	
记录人:邱华		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/03/23
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	戚越
现场照片	 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：组件安装 拍摄时间：2023.03.23 15:13 地 点：廊坊市·大厂机动车检测场 天气：晴 11℃ 拍摄单位：江苏泽衡工程管理有限公司		 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：接地扁铁施工 拍摄时间：2023.03.23 15:09 地 点：施工现场 天气：晴 拍摄单位：江苏泽衡工程管理有限公司	
	描述	组件安装		接地扁铁施工
