

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 28 日

天气：晴

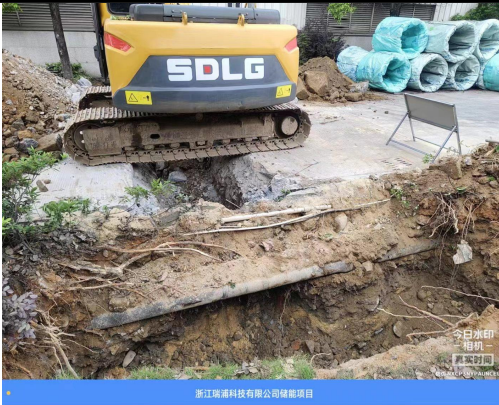
星期：星期五

气温：13--22℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：室内外电缆沟开挖符合图纸设计。 进度情况：室外室内电缆沟及电缆井开挖。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 4 人 挖机一台
其 它 事 项	督促施工单位增加施工人员提高施工进度，尽快采购电缆沟预埋件电缆管及接地扁铁，1#电缆井设计位置与厂方电缆井冲突设计已改图。	
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/04/28
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：电缆沟室外开挖 拍摄时间：2023.04.28 14:37 天气：晴 24℃ 微风1级 监 理 单 位：常州正泰电力工程有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：电缆沟室外开挖 拍摄时间：2023.04.28 15:06 天气：晴 24℃ 微风1级 监 理 单 位：常州正泰电力工程有限公司	
描述	室外电缆沟路面开挖		
