

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 08 日

天气：晴

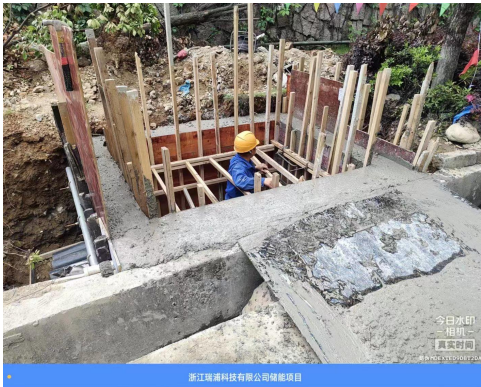
星期：星期一

气温：13--22℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：1#电缆井模板支护及浇筑振捣到位，1#电缆井防水处理符合图纸设计要求。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成一个电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 4 人 振捣器 1 台 电焊机一台 切割机一台
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/08
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 今日水印 相机 【真实时间】 2023/05/08 14:01 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：1#电缆井浇筑完成 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 拍 摄 时 间：2023.05.08 14:01 天 气：多云 21℃ 西北风2级 监 理 单 位：湖州正泰电力工程有限公司	 今日水印 相机 【真实时间】 2023/05/08 10:05 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：2#电缆井做防水 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南瑞工业区) 拍 摄 时 间：2023.05.08 10:05 天 气：多云 18℃ 西北风3级 监 理 单 位：湖州正泰电力工程有限公司	
描述	1#电缆井浇筑	2#电缆井防水处理	
