

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 19 日

天气：晴

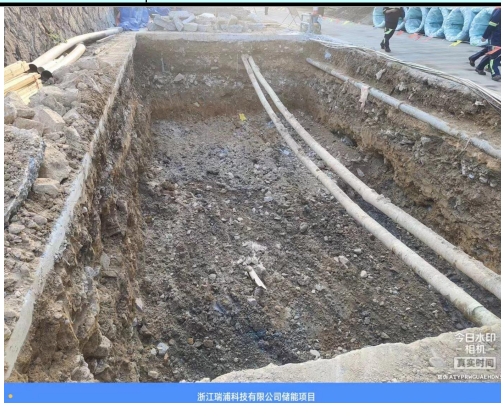
星期：星期五

气温：13--28℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：液冷一体柜基础开挖尺寸受场地限制，地下管道影响未能与图纸设计保持一致，现场已通知施工方明日进行整改，要求严格按照图纸设计施工，整改完成后报我部验收合格可进入后续工序施工。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 2 人 挖机 1 台
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/19
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：升压舱基础放线 拍摄时间：2023.05.19 17:27 天 气：晴 28℃ 东南风3级 监 理 单 位：常州正泰电力工程咨询有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：液冷柜基础开挖 拍摄时间：2023.05.19 17:26 天 气：晴 28℃ 东南风3级 监 理 单 位：常州正泰电力工程咨询有限公司	
描述	汇流升压舱基础钢筋绑扎前基础放线	液冷一体柜基础开挖	
