

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 30 日

天气：晴

星期：星期二

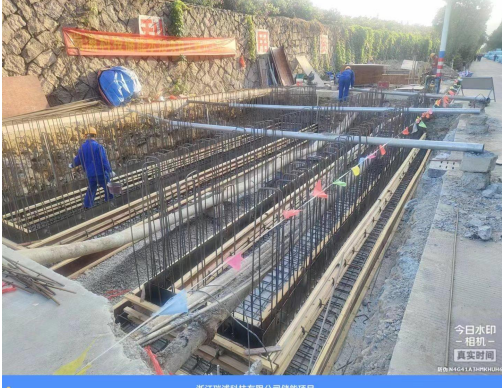
气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：汇流升压舱基础预埋件进场检查合格现场加工安装完成，电缆支架角铁检查符合图纸设计要求，止水钢板安装完成，底板模板支护完成，预计明日早晨进行汇流升压舱基础浇筑及液冷储能一体舱基础底板浇筑，现场天气较热，施工时间已合理调整，防暑物资已准备。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 6 人
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/30
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：汇流升压舱预埋件制作 拍摄时间：2023.05.30 17:18 天 气：晴 35℃ 东南风3级 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：汇流升压舱预埋件安装 拍摄时间：2023.05.30 17:16 天 气：晴 35℃ 东南风3级 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	汇流升压舱预埋件检查	升压舱预埋件安装	
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：电缆支架角铁现场检查 拍摄时间：2023.05.30 17:23 天 气：晴 35℃ 东南风3级 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：电缆支架角铁检查 拍摄时间：2023.05.30 17:28 天 气：晴 35℃ 东南风3级 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	电缆支架角铁检查	电缆支架角铁检查	

现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：储能一体柜基础钢板检查 勘 测 时 间：2023.05.30 17:26 天 气：晴 35℃ 东南风3级 监 理 单 位：常州正泰电力工程监理有限公司 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南湾工业园)	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：液冷储能一体柜止水钢板安装完成/底板模板安装完成 勘 测 时 间：2023.05.30 17:22 天 气：晴 35℃ 东南风3级 监 理 单 位：常州正泰电力工程监理有限公司 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南湾工业园)
描述	液冷储能一体柜基础钢板检查	止水钢板及底板模板支护完成
