

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 31 日

天气：晴

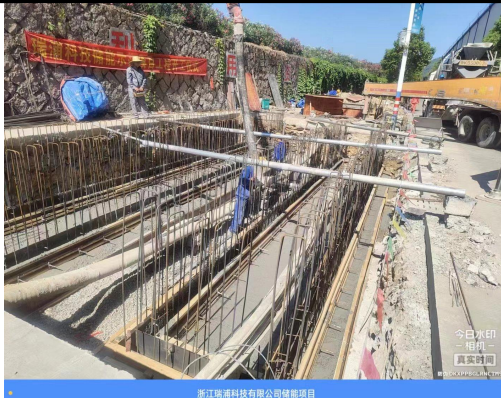
星期：星期三

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：汇流升压舱基础浇筑及液冷储能一体舱基础底板浇筑，模板牢固可靠无漏浆现象，振捣基本到位，要求下班前做好养护。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 6 人 泵车一台
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/05/31
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：汇流升压舱基础浇筑 施 工 时 间：2023.05.31 08:45 天 气：晴 27℃ 西北风2级 监 理 单 位：常州正鼎电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：液冷储能一体柜底板浇筑 施 工 时 间：2023.05.31 08:59 天 气：晴 27℃ 西北风2级 监 理 单 位：常州正鼎电力工程监理有限公司	
描述	汇流升压舱基础浇筑	液冷储能一体柜底板浇筑	
