

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 03 日

天气：阴

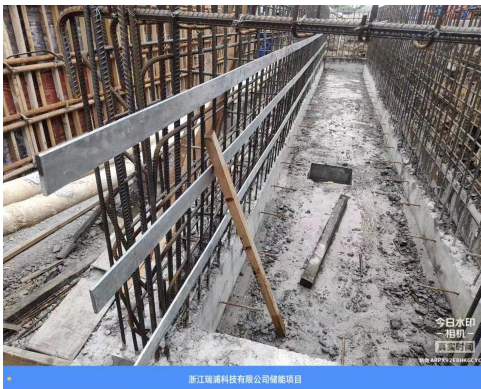
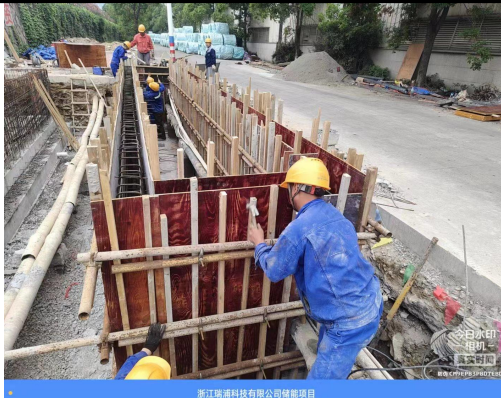
星期：星期六

气温：20--33℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：液冷储能一体舱墙面钢筋绑扎拉结筋梅花布置到位符合图纸设计要求，基础模板支护牢固可靠，局部区域外观欠缺需重新校正已现场通知整改，浇筑前复查。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 7 人
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称:	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/06/03
施工单位:	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 液冷储能一体舱预埋件安装 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(高岗工业区) 拍摄时间: 2023.06.03 16:03 天气: 晴 29°C 东风2级 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 液冷储能一体舱基础模板支护 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(高岗工业区) 拍摄时间: 2023.06.03 16:05 天气: 晴 29°C 东风3级 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
描述	一体舱电缆架预埋件安装	液冷储能一体舱基础末班支护	
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 液冷储能一体舱拉结筋梅花布置检查 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(高岗工业区) 拍摄时间: 2023.06.03 16:07 天气: 晴 29°C 东风3级 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序: 液冷储能一体舱施工进度 地 点: 丽水市·浙江青山钢铁有限公司(高岗工业区) 拍摄时间: 2023.06.03 16:05 天气: 晴 29°C 东风3级 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
描述	拉结筋安装检查	一体舱施工进度	
