

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 01 日

天气：阵雨

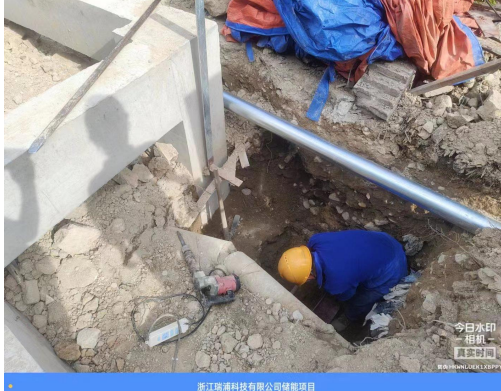
星期：星期六

气温：20--36℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：接地主网焊接符合规范要求，后续进行焊渣清理及防腐，接地极整改中，消防安装因厂方消防未泄压未施工完成。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成，汇流升压舱基础浇筑完成，设备处电缆沟完成，电缆支架及内接地扁铁主网连接完成，消防完成 50%。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 5 人
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/07/01
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：消防管安装检查 拍摄时间：2023.07.01 15:59 天气：多云 36℃ 西北风3级 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：消防施工 拍摄时间：2023.07.01 16:03 天气：多云 36℃ 西北风3级 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	消防安装检查	消防安装大样	
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：接地与厂房接地连接 拍摄时间：2023.07.01 16:43 天气：多云 36℃ 西北风2级 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：接地极整改重新开挖 拍摄时间：2023.07.01 16:01 天气：多云 36℃ 西北风3级 监理单位：常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	接地主网连接	接地极整改	
