

监 理 日 志

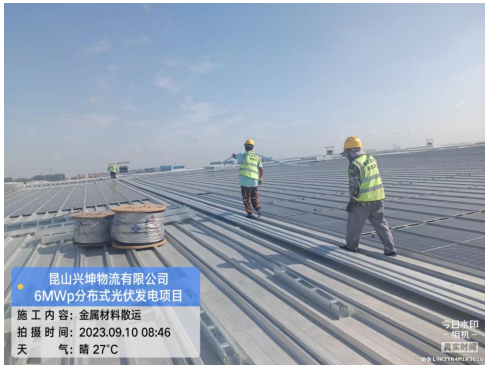
日期: 2023 年 09 月 10 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 25 °C ~ 31 °C

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查工人佩戴安全帽正常, 检查吊车手续齐全, 周围已拉警示线, 吊带无磨损。 二、检查 MC4 插制作符合要求, 套管连接良好。 三、检查套管切割长度符合要求, 套管内壁打磨光滑无毛刺。 四、召开第十六次监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、上午材料吊装、散运六人, 下午套管切割、打磨两人, MC4 线插制作三人, 套管连接一人。 二、钡车一台, 吊车一台, 班组管理人员一人, 总包管理人员五人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 施 工 内 容: 金属材料散运 拍 摄 时 间: 2023.09.10 08:46 天 气: 晴 27 °C  昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目 施 工 内 容: 金属材料吊装 拍 摄 时 间: 2023.09.10 08:34 天 气: 晴 26 °C	
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监理工程师:
