

监 理 日 志

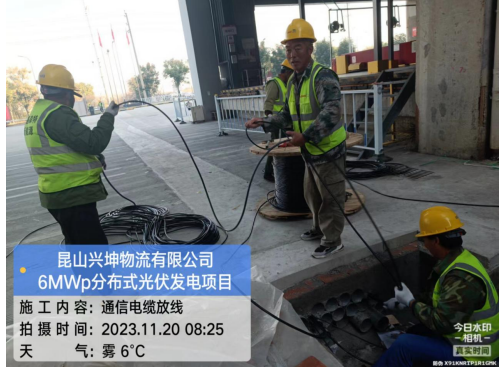
日期：2023 年 11 月 20 日

天气：晴

星期：日

气温：8℃~19℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查电缆桥架放线，机械操作到位，专人看护。 三、管理人员在现场指挥，电缆放线为专业施工队。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场通信电缆施工人员六人，交流电缆放线十人。 二、升降机两台，电缆输送机一台，卷扬机一台，施工队管理二人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：电缆放线 拍 摄 时 间：2023.11.20 08:13 天 气：晴 3℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：通信电缆放线 拍 摄 时 间：2023.11.20 08:25 天 气：雾 6℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师:
