

监 理 日 志

日期：2023 年 10月17日

天气：晴

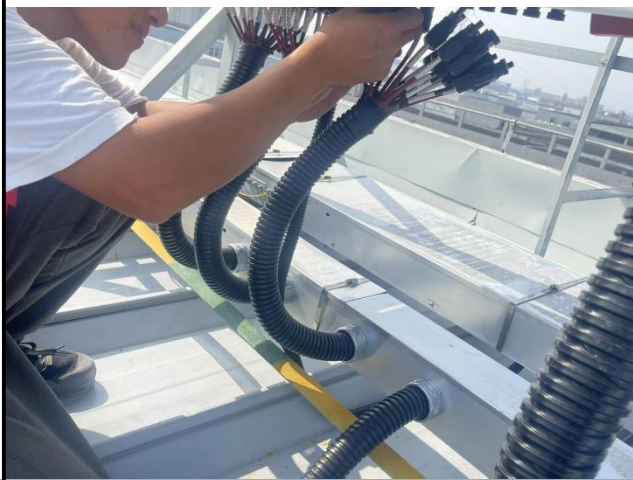
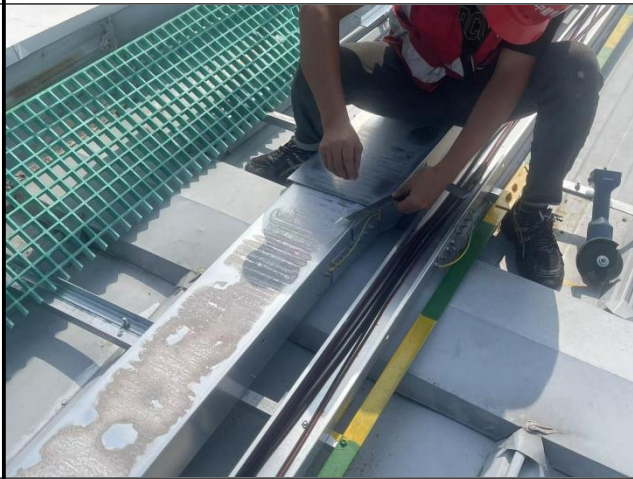
工程名称:宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温: 14~27℃

°C

监 理 工 作 情 况	质量情况：1号屋面逆变器电压检测接头无损坏。	
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%，运维通道安装90%，组件安装99%，逆变安装11台，交流电缆放线完成20根。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成100%，运维通道安装100%，安装围栏100%，直流电缆敷设完成55%，组件安装完成25%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，逆变安装三台，运维通道80%，直流电缆敷设完成100%，桥架安装83%，组件安装完成100%。	
	组件到货10008块，278箱。	
	材料进场情况：	
	逆变器到货 20台	总量 20 台
	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
	直流线到货 20 盘	总量5.99MW
	组件到货10008块	总量12048块
	箱变到货4台	一次、二次预制舱1台
安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，电缆沟处警示带及警示标语齐全。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明电力建设有限公司	施工13人
其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人:杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/10/17
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	唐剑
现场照片			
描述	1号楼屋面逆变器接头电压检测	1号楼屋面接地扁铁加固	
现场照片			
描述	2号桥架盖板		
