

监 理 日 志

日期：2023 年 10月02日

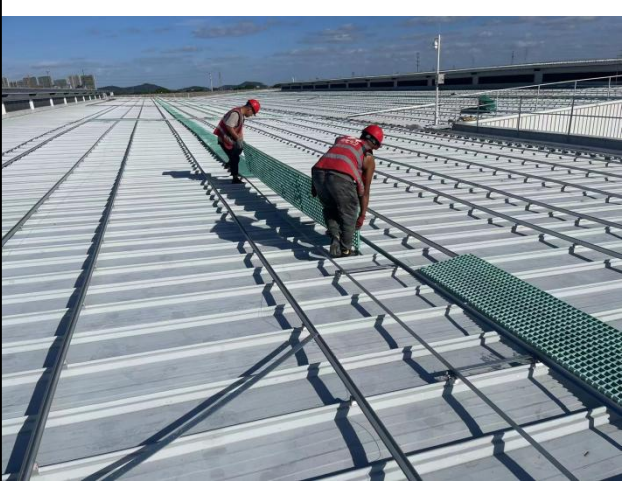
天气：晴

工程名称：宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温：21~33℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日主要进行接入柜停电改造，八点停电验电放电完成后柜体转运至指定位置，检查断开点及接地线连接到位，十二点改造完成，1号屋面组件吊装，2号屋面交流电缆整理进行中。		
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，交流电缆放线完成20根, 桥架安装完成95%, 直流电缆敷设完成100%，组件安装3600块30%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成90%，运维通道安装100%。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，		
	组件到货10008块，278箱。		
	材料进场情况： 逆变器到货 20台		

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/10/02
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	唐剑
现场照片				
描述	2号楼 走路板放置		SVG吊装完成	
现场照片				
描述	接入柜母排连接		业主现场巡视	
