

監理日志

日期：2023 年 09月21日

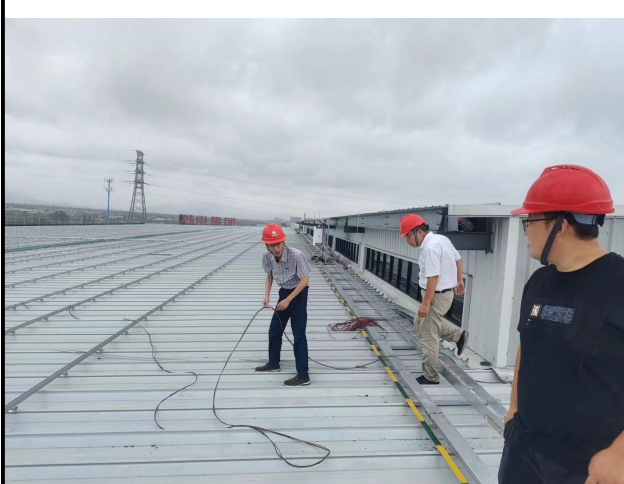
天气：雨

工程名称:宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温: 21~25℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：设备基础实心砖砌体开始，组件安装穿刺垫片放置齐全，光伏线绑扎到位。	
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%, 直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成90%，组件安装2200块。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，交流电缆顶管完成100%	
	材料进场情况：	逆变器到货 20台 总量 20 台
	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
	直流线到货 20 盘	总量5.99MW
	组件到货3636块	总量12048块
	安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，电缆沟处警示带及警示标语齐全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明电力建设有限公司	组件安装 设备基础砌体8人
其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/09/21
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	唐剑
现场照片				
描述	领导检查		基础柱浇筑	
现场照片				
描述	基础柱钢筋检查		基础柱绑扎筋检查	
