

監理日志

日期：2023 年 09月28日

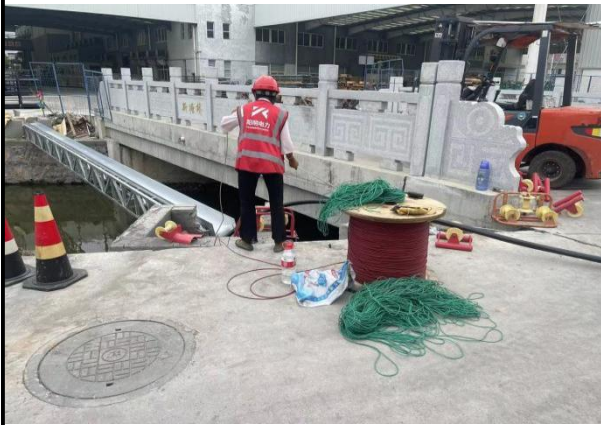
天气：晴

工程名称: 宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目

气温: 20~33℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：18号楼交流电缆放线规格型号符合图纸设计，SVG基础垫层浇筑完成。	
	进度情况：1号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成95%，直流电缆敷设完成100%。2号屋面夹具、导轨安装完成100%，桥架安装完成90%，组件安装3600块。18号楼夹具、导轨安装完成100%。18号楼加固完成100%，交流电缆放线完成13根	
	材料进场情况： 逆变器到货 20台	总量 20 台
	夹具到货 5.99MW	总量 5.99MW
	导轨到货 5.99MW	总量 5.99MW
	桥架到货 5.99MW	总量 5.99MW
	中压、边压块到货5.99MW	总量5.99MW
	直流线到货 20 盘	总量5.99MW
	组件到货3636块	总量12048块
	安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全，电缆沟处警示带及警示标语齐全。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	浙 江 阳 明 电 力 建 设 有 限 公 司	土建施工5人 光伏施工12人
其 它 事 项	无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人:杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/09/28
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	唐剑
现场照片			
描述	交流电缆放线	SVG基础垫层施工	
