

监 理 日 志

日期：2023 年 09月13日

星期：三

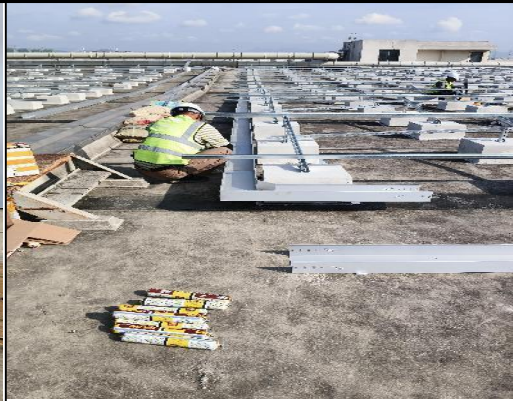
工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MWp屋顶光伏发电项目

天气：多云

气温：24～31℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查支架安装质量，符合设计及规范要求。检查逆变器支架焊接情况。	
	进度情况：屋面吊装光伏基础水泥墩84拖共1008个安装90%，光伏支架安装完成70%，桥架安装90%，逆变器安装100%。	
	材料进场情况：	逆变器到货6台 总量6 台
	水泥墩到货0.8MWp	总量0.8MWp
	支架到货0.8MWp	总量0.8MWp
	桥架到货0.8MWp	总量0.8MWp
	中压、边压块到货 0.8MWp	总量0.8MWp
	直流线到货0.8MWp	总量0.8MWp
	组件到货0.8MWp	总量0.8MWp
	接地圆钢0.8MWp	总量0.8MWp
安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约6人，25T吊车1台，3.5T叉车1台。支墩打胶，逆变器安装，桥架安装，组件吊装。
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称	台州市椒江杭泰电力有限公司水晶光电（三期）0.8MW _p 屋顶光伏发电项目		巡检日期	2023/09/13
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	张小栋
现场照片				
描述	组件吊装		桥架安装	
现场照片				
描述	逆变器安装		支墩打胶	
