

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 22 星期 五	气候	多云	气温	1-8℃
监理人员 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求			材料进场： 汇集站设备到货		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:85 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 60#箱变基础钢筋绑扎、48#箱变基础开挖，3/7 灰土回填。 二、汇集站及储能工程： 1. 电缆沟钢筋模板施工。 2. 35KV1#配电室室外电缆沟钢筋施工。 3. A-B 段边坡施工、电气设备吊装安装。 4. 主控楼外墙保温施工、构架区回填压实。 5. 主控楼防水施工。 三、送出线路： 1. 送出线路 G6 塔基基础开挖 80%，铁塔组立 G25 完成 50%。 四、集电线路： 1. EFN14,EFN1 浇筑完成。				
	监 理 日 作 1. 集电线路接地沟开挖检查，EFN14,EFN1 浇筑旁站。 2. 光伏区 60#箱变基础钢筋绑扎巡视、48#箱变基础开挖，3/7 灰土回填。 3. 汇集站电缆沟钢筋模板验收，设备吊装安装巡视。 4. 二次室外墙保温施工巡视,汇集站主控楼地板砖施工巡视，主控楼屋面防水施工检查。 5. 送出线路 G25 铁塔组立安全巡视，G6 塔基基础开挖巡视检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 二次室外墙保温施工
拍摄时间: 2024.11.22

天气: 雾-1°C
地点: 永靖县·方台村

建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 上海电力建设有限责任公司

二次室外墙保温施工



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 设备吊装安装
拍摄时间: 2024.11.22

天气: 雾-2°C
地点: 永靖县·方台村

建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 上海电力建设有限责任公司

设备吊装安装



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 设备吊装安装
拍摄时间: 2024.11.22

天气: 雾-2°C
地点: 永靖县·方台村

建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 上海电力建设有限责任公司

设备吊装安装



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 主控楼防水施工
拍摄时间: 2024.11.22

天气: 轻度雾霾10°C
地点: 永靖县·方台村

建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 上海电力建设有限责任公司

主控楼防水施工



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目


施工内容: 汇集站电缆沟钢筋模板验收
拍摄时间: 2024.11.22

天气: 晴10°C
地点: 永靖县·方台村

建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 上海电力建设有限责任公司

汇集站电缆沟钢筋模板验收

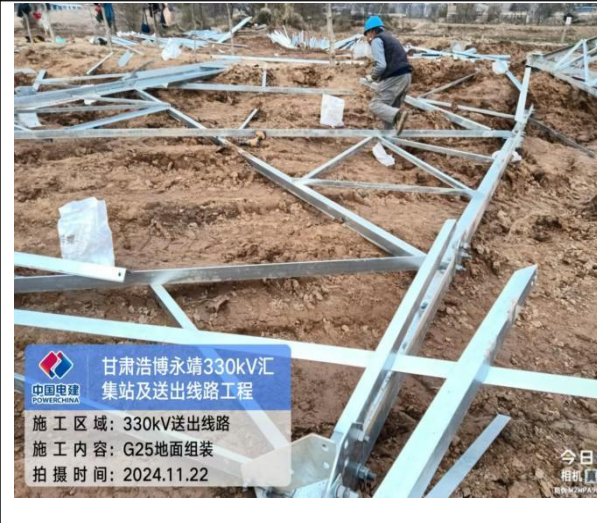

甘肃浩博永靖330kV汇集站及送出线路工程

施工区域: 330kV送出线路

施工内容: G25地面组装

拍摄时间: 2024.11.22

送出线路铁塔组装
