

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 11 月 23 星期 六	气候	多云	气温	1-8℃
监理单位 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求	材料进场： 汇集站设备到货				
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:85 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 49#箱变基础垫层浇筑，59#箱变基础垫层浇筑。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 电缆沟钢筋模板施工。 2. 1#、2#SVG 接地制作安装、设备底座焊接完 100%，35kV 互感器、隔离开关及断路器安装完成 20%，35kV 接地变吊装完成 100%，35kV 开关柜并柜安装完成 100%，开关柜母排安装完成 45%，330kV 电压互感器及避雷器安装完成 60%，330kV HGIS 防尘棚搭设完成 50%。 三、送出线路： 1. 送出线路基础开挖 G6 完成 85%，G8 完成 30%，铁塔组立 G24 完成。 四、集电线路： 1. EFN13 支模完成,GHN17 浇筑完成,IN1 挖接地完成。				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 集电线路接地沟开挖检查,集电线路 GHN15#塔基基坑验收,集电线路 EF12#塔基基坑验收。 2. 49#、59#箱变基础垫层浇筑巡视检查。 3. 电缆沟钢筋模板施工巡视检查。 4. 汇集站电气施工监理人员巡视检查。 5. 送出线路 G24 铁塔组立安全巡视，G6、G6#塔基基础开挖巡视检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 集电线路GHN15#塔基坑验收
天气: 阴 8°C
拍摄时间: 2024.11.23
地点: 永靖县·方台村
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限公司


集电线路基坑验收



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 集电线路EF12#塔基坑验收
天气: 阴 8°C
拍摄时间: 2024.11.23
地点: 永靖县·方台村
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限公司

集电线路基坑验收

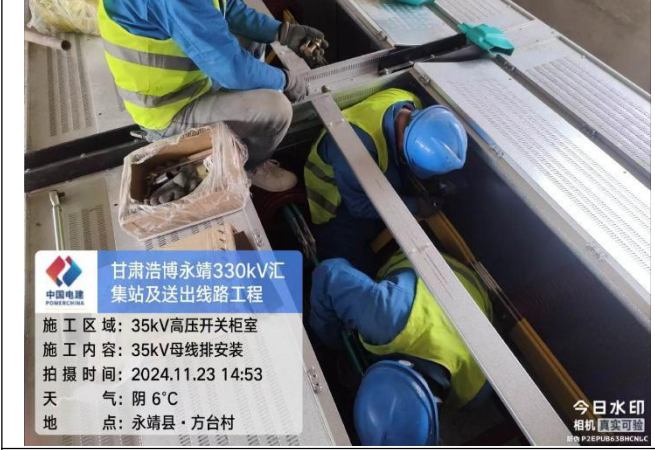

甘肃浩博永靖330kV汇集站及送出线路工程

施工区域: 35kV高压开关柜室
施工内容: 35kV母线排安装
拍摄时间: 2024.11.23 14:53
天气: 阴 6°C
地点: 永靖县·方台村

汇集站电气施工



甘肃浩博永靖330kV汇集站及送出线路工程

施工区域: 330kV施工区域
施工内容: 330kV电压互感器安装
拍摄时间: 2024.11.23 14:43
天气: 阴 6°C
地点: 永靖县·方台村

汇集站电气施工



甘肃浩博永靖330kV汇集站及送出线路工程

施工区域: 330kV送出线路
施工内容: G6挖坑
拍摄时间: 2024.11.23

送出线路塔基基础开挖



甘肃浩博永靖330kV汇集站及送出线路工程

施工区域: 330KV送出线路
施工内容: G24立塔
拍摄时间: 2024.11.23 16:56:32

送出线路铁塔组装
