

# 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目


日期	2024年 11月 25 星期 一	气候	小雪	气温	-8-2℃
监理人员 动态：4人，巡视、检查、旁站，满足现场施工要求		材料进场：			
施工方人员动态：主要管理人员：10人，施工人员：85人，全站仪1台，水准仪1台，GPS测量仪1台，满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机2台，装载机3台，自卸车5台，洒水车1台，打桩机4台，夯实机4台，压路机1台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区未施工。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 电缆沟钢筋模板施工。 2. 边坡 C-D 段边坡施工完成 2% 3. 1#、2#SVG 接地制作安装、设备底座焊接完成 50%，35kV 互隔离开关及断路器安装 20%，35KV 高压开关柜并柜 50%，35KV 接地变吊装完成 100%。 三、送出线路： 1. 送出线路基础开挖 G6 完成 100%，G8 完成 50%，铁塔组立 G24 完成。 四、集电线路： 1. EFN13 浇筑完成。				
监 理 日 工 作 内 容	1. 集电线路 GHN13#塔基基础浇筑旁站。 2. 签署施工资料。 3. 电缆沟钢筋模板施工巡视检查。 4. 汇集站电气施工监理人员巡视检查，今日建设单位、总包单位、监理部对汇集站进场设备进场开箱检查。 5. 送出线路 G24 铁塔组立安全巡视，G6、G8#塔基基础开挖巡视检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌	总监签阅	胡斌		



汇集站电气设备开箱检查



汇集站电气设备吊装安装

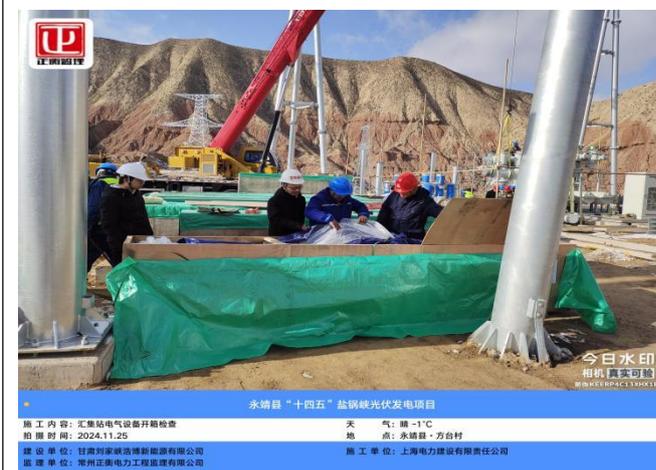

汇集站电气设备开箱检查



汇集站电气施工



送出线路塔基基础开挖



汇集站电缆沟施工
