


监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期		2024 年 11 月 26 星期 二		气候		小雪		气温		-8-2℃	
监理人员 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求						材料进场：					
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:85 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.											
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。											
施 工 部 位 进 度 情 况		今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 1-3#隔油池基础夯实。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 电缆沟钢筋模板施工。 2. 边坡 C-D 段边坡施工完成 2% 3. 330kV 电压互感器及避雷器安装完成 100%，1#、2#SVG 网门安装焊接完成 80%，HGIS 安装完成 30%，35kV 设备接地制作及安装完成 40%。 三、送出线路： 1. 送出线路基础开挖 G8 完成 70%,钢筋绑扎 G6 完成 100%，送出线路 G3 铁塔吊装。 四、集电线路： 1. 未施工。									
监 理 日 作 今 工 内 容		1. 送出线路 G6 塔基基坑验收。 2. 签署施工资料。 3. 电缆沟钢筋模板施工巡视检查。 4. 汇集站电气施工监理人员巡视检查，今日开监理周例会。 5. 送出线路 G24 铁塔组立安全巡视，G3 铁塔吊装安全检查。									
检查发现问题及处理措施		巡视检查工地未见异常情况									
协调内容或其他		无									
记录人		高治斌				总监签阅		胡斌			



送出线路 G6 塔基基坑验收

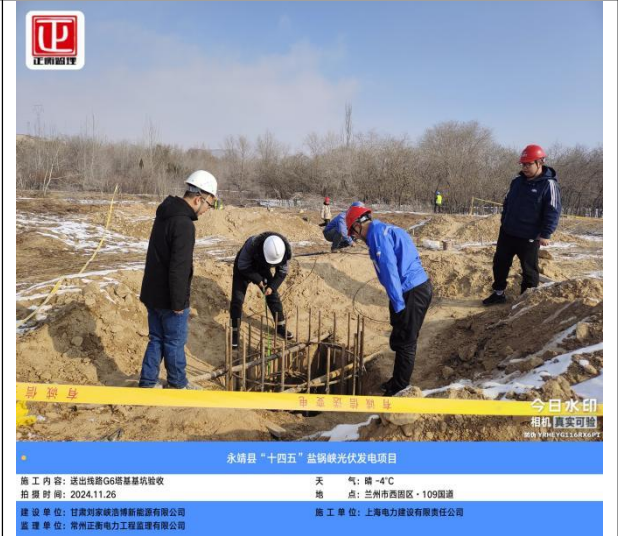

送出线路 G6 塔基基坑验收



汇集站电气施工



周例会



汇集站电缆沟施工



箱变基础施工
