

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目


日期	2024 年 11 月 27 星期 三	气候	多云	气温	-5-2℃
监理人员 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求			材料进场：		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:85 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 1-3#隔油池基础夯实，10-17#箱变隔油池基础夯实。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 电缆沟钢筋模板施工。 2. 边坡 C-D 段边坡施工完成 2% 3. 汇集站主控楼地板砖、墙砖施工。 4. 1#、2#SVG 接地制作安装、设备底座焊接完成 30%；35kV 互隔离开关及断路器安装 20%；35KV 高压开关柜并柜 30%；330KV 设备区避雷器互感器安装 40%；35kV 低压侧隔离开关附件安装及调整，母线支柱底座焊接 30%；HGIS 套管安装 25%。 三、送出线路： 1. 送出线路基坑开挖 G8 完成 90%,G2 完成 30%，铁塔地面组装 G3 完成 30%。 四、集电线路： 1. ABN26 绑扎钢筋完成 20%，DN5 绑扎钢筋完成 50%。				
	监 理 工 作 内 容	1. 集电线路钢筋绑扎巡视检查。 2. 签署施工资料。 3. 电缆沟钢筋模板施工巡视检查。 4. 汇集站电气施工监理人员巡视检查。 5. 送出线路 G2、G9 基坑开挖巡视，G3 铁塔吊装安全检查。			
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	




汇集站高压柜接线



汇集站电气施工

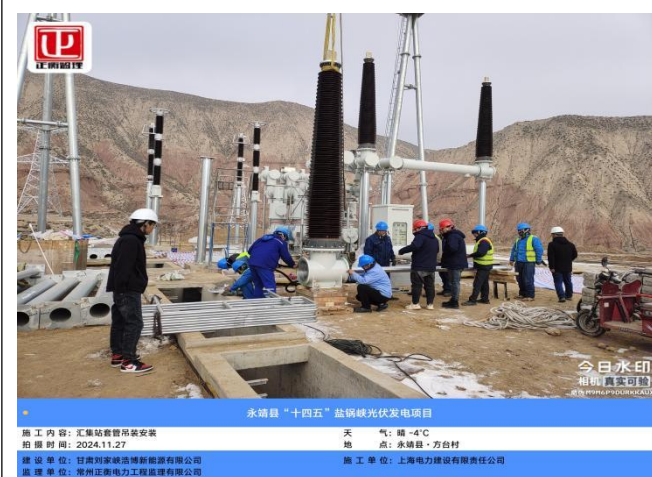

汇集站电气施工

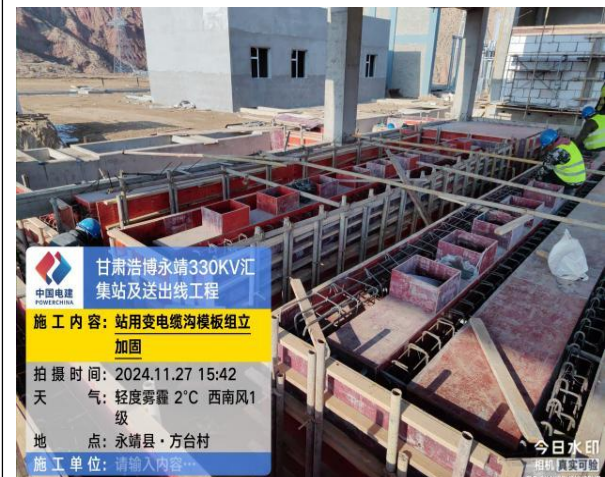

汇集站电缆沟施工



送出线路基坑开挖



箱变基础施工
