

# 监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024年12月15 星期 天	气候	多云	气温	-9-1℃
监理人员 动态:	4人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场:		
施工方人员动态:	主要管理人员: 10人, 施工人员: 75人, 全站仪 1台, 水准仪 1台, GPS 测量仪 1台, 满足施工现场要求。				
施工机械动态:	挖机 2台, 装载机 3台, 自卸车 5台, 洒水车 1台, 打桩机 4台, 夯实机 4台, 压路机 1台 满足施工现场要求。				
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工: 一、光伏区: 1. 光伏区 A30 支架安装 10 组。 二、汇集站电气工程及储能工程: 1. 主控楼楼梯间踏步贴砖, 线管穿线、墙面刮腻子; 围墙墙体砌筑。 2. 330KV 设备区管母安装 (100%), 330KV 变压器安装完成 60%, 保护屏等电位连接完成 20%, 10kV 小室屏柜就位安装完成 80%, 电缆敷设 25%。 3. 二次室屏柜吊装就位, 二次电缆放线。 三、送出线路: 1. 送出线路 G18-G20 中相展放完成, G54 紧断线, G53-G54 展放导线, G57-门架紧断线。 四、集电线路: 1. 今日未施工。				
监 理 日 作 工 内 容	1. 汇集站二次电缆放线巡视检查。 2. 二次室屏柜吊装安装就为, 监理人员巡视旁站。 3. 集电线路接地焊接巡视检查。				
检 查 发 现 问 题 及 处 理 措 施	巡视检查工地未见异常情况				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人	高治斌	总监签阅	胡斌		




汇集站电气安装



汇集站电气施工巡视




汇集站电气安装

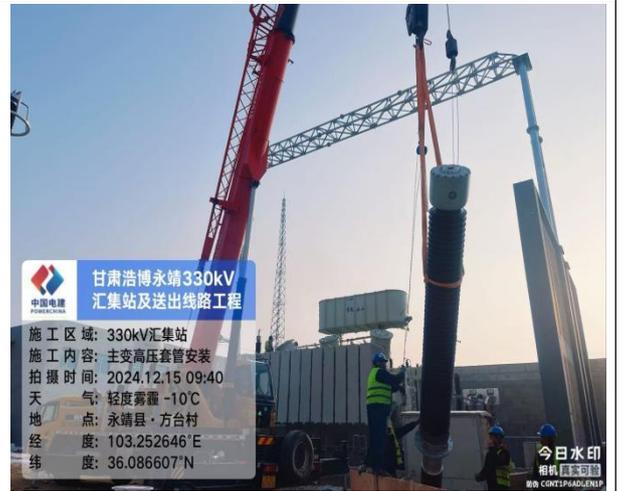

汇集站电气安装



送出线路施工

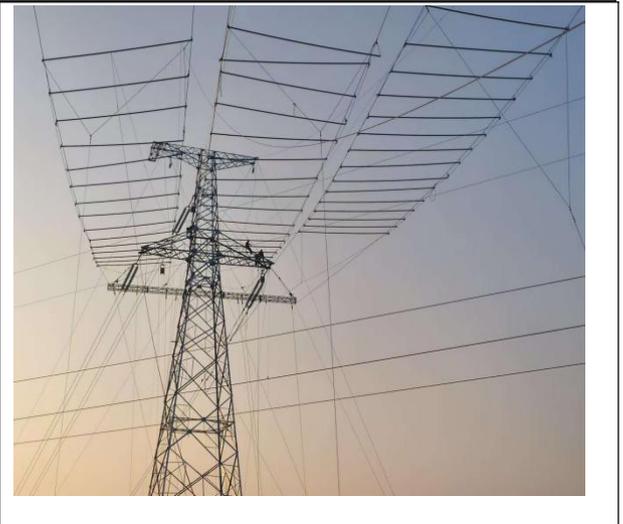

送出线路施工
