

监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024年12月20日 星期五	气候	多云	气温	-9-2℃
监理人员 动态: 4人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场:			
施工方人员动态: 主要管理人员: 10人, 施工人员: 75人, 全站仪 1台, 水准仪 1台, GPS 测量仪 1台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态: 挖机 2台, 装载机 3台, 自卸车 5台, 洒水车 1台, 打桩机 4台, 夯实机 4台, 压路机 1台 满足施工现场要求。					
施工部位 施工进度	今日施工: 一、光伏区: 1. 光伏区 A33 支架安装 5 组, A1-6 支架安装完成 30 组。 二、汇集站电气工程及储能工程: 1. 线管穿线已完成 80%、墙面刮腻子已完成 40%、卫生间贴砖已完成 70%; 消防水泵房墙面抹灰已完成 80%; 围墙墙体砌筑已完成 70%; 化粪池基坑开挖已完成 40%。 2. 330kV HGIS 主变间隔六氟化硫注气 35%; 330kV 变压器内部接线; 电缆敷设 11%; 330kV 引流线压接及安装 15%; 35KV 母线加工安装 10%。 三、送出线路: 1. 送出线路 G54-G53 架线; 铁塔地面组装 G7 完成 100%; G2 完成 60%;。 四、集电线路: 1. EFN11, GN1, 2, 3 挖接地完成 60% ABN25, ABN26 接地沟开挖 90%。				
监理今日工作内容	1. 汇集站导线压接、吊装安装巡视检查。 2. 围墙砌筑监理人员巡视。 3. 集电线路接地沟开挖巡视检查。 4. 汇集站 330kV HGIS 主变间隔六氟化硫注气, 变压器内部接线, 电缆敷设, 监理人员检查。 5. 送出线路 G54-G53 架线, 铁塔地面组装 G7 安全旁站、巡视。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌	总监签阅	胡斌		



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站导线压接
天气: 晴 0°C
拍摄时间: 2024.12.20
地点: 永靖县·方台村

建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源开发有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站导线压接
天气: 晴 0°C
拍摄时间: 2024.12.20
地点: 永靖县·方台村

建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源开发有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

汇集站施工

导线压接



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站围墙砌筑
天气: 晴 0°C
拍摄时间: 2024.12.20
地点: 永靖县·方台村

建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源开发有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司




永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站电气施工
天气: 晴 0°C
拍摄时间: 2024.12.20
地点: 永靖县·方台村

建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源开发有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

围墙施工

汇集站电气施工

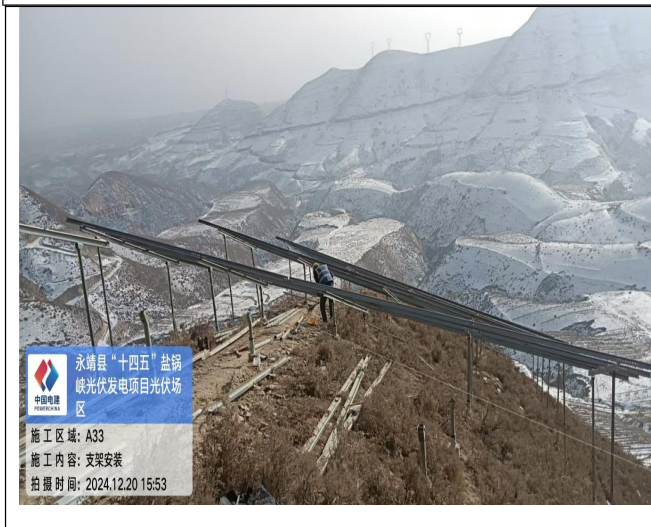

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工区域: A33
施工内容: 支架安装
拍摄时间: 2024.12.20 15:53



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 送出线路施工

支架安装

送出线路施工
