

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 26 星期 四	气候	多云	气温	-9-2℃
监理人员 动态：4 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求			材料进场： 今日组件到货		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人, 施工人员:75 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 5 台, 洒水车 1 台, 打桩机 4 台, 夯实机 4 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 A1-6 支架安装 30 组，A16-1 支架安装完成 45 组。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 卫生间贴砖已完成 100%;消防水泵房墙面抹灰已完成 100%;围墙墙体砌筑已完成 80%。 2. 330KV 变压器安装接线;电缆敷设 5%;330kV 引流线压接及安装 10%;二次电缆剥线处理 5%;35kV 矩形母线制作安装 10%;主变热油循环 40%;10kV 站用变高压电缆敷设 100%。 三、送出线路： 1. 送出线路 G52-G53 展放、架线。 四、集电线路： 1. 未施工。				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 汇集站导线压接、吊装安装巡视检查；汇集站铜牌安装现场检查；主变热油试验监理人员旁站检查。 2. 围墙砌筑、墙体刮白监理人员巡视。 3. 今日组织总包单位电气人员对集电线路接地电阻进行检查测量，测量合格。 4. 汇集站 330kV HGIS 主变间隔六氟化硫注气，变压器内部接线，电缆敷设，监理人员检查。 5. 送出线路 G52-G53 展放、架线；铁塔组装安全旁站、巡视。 6. 今日组件厂家至永靖项目进行组件安装前交底，今日组织总包单位安全人员对汇集站、送出线路进行节前安全检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 组件厂家交底
天气: 晴, -8°C
拍摄时间: 2024.12.26
地点: 永靖县·兴园路
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

组件到货、厂家交底



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站围墙砌筑
天气: 晴, 0°C
拍摄时间: 2024.12.26
地点: 永靖县·方台村
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

围墙砌筑



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站主变热油试验
天气: 晴, 0°C
拍摄时间: 2024.12.26
地点: 永靖县·方台村
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司


铜牌安装



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站主变热油试验
天气: 晴, 0°C
拍摄时间: 2024.12.26
地点: 永靖县·方台村
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

支架安装

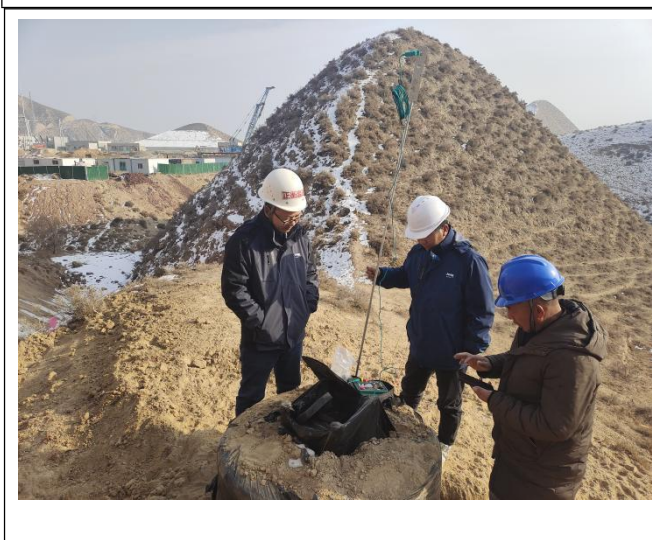

集电线路接地电阻测量



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站节前安全检查
天气: 晴, 0°C
拍摄时间: 2024.12.26
地点: 永靖县·方台村
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

汇集站节前安全检查
