


监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 01 星期 天	气候	晴	气温	6-19℃
监理人员 动态：6 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求			材料进场:		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:266 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求。					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 2 台,洒水车 1 台,夯实机 1 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 光伏区： 1. A11-1（585）组件安装8组，A11-2（585）组件安装10组，A23（580）组件安装5组，A24（580）组件安装15组；A27电缆敷设200m，A37电缆敷设400m；A1-7地块支架安装20组，A1-7 580组件安装20组。				
	二、汇集站工程及储能工程： 1. 消缺。 三、送出线路： 1. 消缺。 四、集电线路： 1. ABN27 接地开挖完成 80%。 五、对策间隔：消缺				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。 2. 汇集站、送出线路消缺巡视检查。 3. 集电线路安全巡视检查，接地沟开挖检查。 4. 逆变器至箱变接线，电缆敷设监理人员巡视检查。 5. 光伏区箱变、逆变器倒送电，监理部人员全线巡视检查，汇集站后台监控合闸跟进。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人		高治斌		总监签阅	
				胡斌	

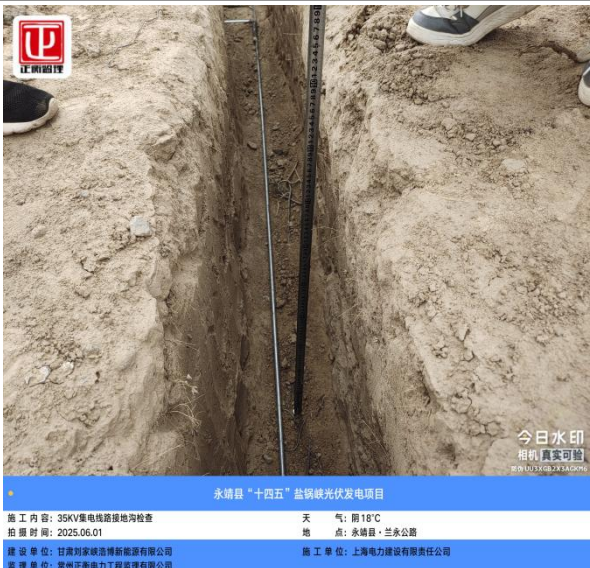

集电线路巡视检查

集电线路巡视检查



集电线路巡视

