


监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025年06月08 星期 天	气候	晴	气温	6-25℃
监理人员 动态: 6人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求			材料进场:		
施工方人员动态: 主要管理人员: 10人, 施工人员: 266人, 全站仪1台, 水准仪1台, GPS测量仪1台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态: 挖机2台, 装载机3台, 自卸车2台, 洒水车1台, 夯实机1台, 压路机1台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工: 光伏区: 1. A11-1 (585)组件安装 10组, A11-2 (585)组件安装 10组, A23 (580)组件安装 5组, A24 (580)组件安装 8组; A10 电缆沟开挖 800米: 焊接地 36组: 放线 40组: 背拉筋 30组, A34-2 桩位恢复 13个, A30-4、5、6 做组件 MC4 插头 40组, 回填电缆沟 500米, 安装直接组件 7组, A35-1 桩位恢复 4个; A27 支架安装 5组, A27 (585)组件安装 5组, A27 逆变器安装 1台, A27 电缆敷设 100m, A37 电缆敷设 100m, A28 低压电缆沟开挖 200m。 二、汇集站工程及储能工程: 1. 消缺。 三、送出线路: 1. 消缺。 四、集电线路: 1. 消缺。 五、对策间隔: 消缺				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 光伏区组件、支架安装、电缆敷设、高低压电缆沟开挖监理人员巡视检查。 2. 汇集站、送出线路、集电线路消缺巡视检查。 3. 逆变器至箱变接线, 电缆敷设监理人员巡视检查。 4. 围栏施工巡视检查。 5. 电缆敷设、防火涂料粉刷、光伏区接地焊接巡视检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌	总监签阅	胡斌		

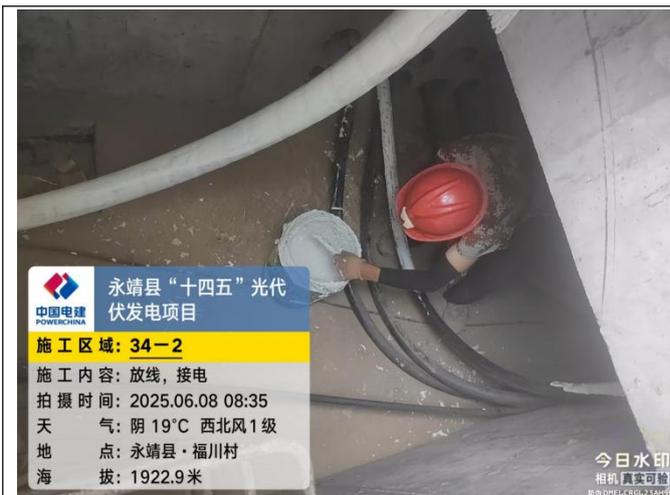

电缆敷设、防火涂料粉刷巡视检查



光伏区接地焊接



光伏区组件安装

