

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 13 星期 五	气候	晴转小雨	气温	8-20℃
监理人员 动态：6 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场:				
施工方人员动态：主要管理人员:10 人, 施工人员:236 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 2 台, 洒水车 1 台, 夯实机 1 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工: 光伏区: 1. A10 电缆沟开挖 800 米: 焊接地 36 组: 放线 40 组: 背拉筋 30 组, A30 — 2 组件加固, A35-3 回填电缆沟 3000 米, A30-4、5、6 方阵做组件 MC4 插头 61 组, 回填电缆沟 500 米, 安装背拉筋 30 组; A27 支架安装 8 组, A27 (585) 组件安装 8 组, A27 逆变器安装 1 台, A27 电缆敷设 100m, A37 电缆敷设 100m, A28 低压电缆沟开挖 200m, A24-1 围栏立柱浇筑 320 个。 二、汇集站工程及储能工程: 1. 消缺。 三、送出线路: 1. 消缺。 四、集电线路: 1. 消缺。 五、对策间隔: 消缺				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 光伏区组件、支架安装、电缆敷设、高低压电缆沟开挖监理人员巡视检查。 2. 汇集站、送出线路、集电线路消缺巡视检查。 3. 逆变器至箱变接线、电缆敷设; 箱变电缆防火封堵, 电缆刷防火涂料监理人员巡视检查。 4. 围栏施工巡视检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	




箱变电缆防火封堵



电缆刷防火涂料



围栏施工

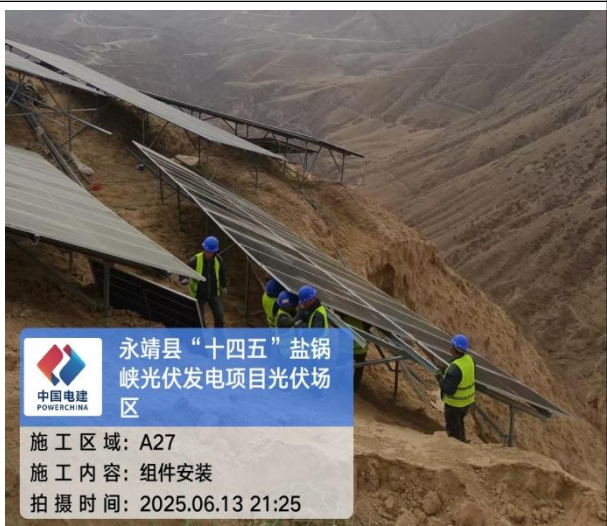

组件安装
